

成都官仓 110 千伏变电站第二电源 110 千伏线路工程
水土保持监测季度报告表

(2025 年第 3 季度)

编制单位：四川电力设计咨询有限责任公司

2025 年 10 月



目录

1 项目及水土保持工作概况	1
1.1 项目概况.....	1
1.2 本季度水土保持监测工作概述.....	2
2 主体工程进展情况	3
3 水土保持监测	4
3.1 监测分区.....	4
3.2 监测内容和方法.....	4
4 结论及建议	16
4.1 结论.....	23
4.2 存在问题及完善建议.....	24
4.3 本项目后期监测工作安排.....	30

生产建设项目水土保持季度报告表

监测时段: 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

项目名称		成都官仓 110 千伏变电站第二电源 110 千伏线路工程				
建设单位 联系人及 电话	缪毅 13550008856	监测项目负责人(签字): 吴川			生产建设单位(盖章): 	
填表人及 电话	吴川 17302286960	2025 年 9 月 30 日			2025 年 9 月 30 日	
主体工程进度		截止 2025 年 9 月底: 官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程本季度无新增土建基础, 回龙 220kV 变电站官仓 110kV 间隔改造工程未开展土建工作; 线路工程基础开挖累计完成 80 基, 本季度新增 3 基; 基础浇筑累计完成 80 基, 本季度新增 3 基; 铁塔组立累计完成 72 基, 本季度无新增; 本季度已开始架线, 已配套设置牵张场 4 处。				
指标		设计总量	本季度	累计		
抗动地表 面积 (hm ²)	合计		11.34	0.57	9.48	
	变电工程	官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程	0.01	0	0.01	
		回龙 220kV 变电站官仓 110kV 间隔改造工程	0.01	0	0	
		小计	0.02	0	0.01	
	线路工程	塔基及其施工临时占地区	6.69	0.22	6.53	
		电缆沟	0.07	0	0	
		施工道路	3.12	0.15	2.74	
		牵张场	0.55	0.20	0.20	
		跨越施工场地	0.89	0	0	
小计		11.32	0.57	9.47		
弃土(石、 渣)量(万 m ³)	合计		0	0	0	
	变电工程		0	0	0	
	线路工程		0	0	0	
	渣土防护率(%)		92	95	95	
损坏水土保持设施数量(hm ²)		11.34	0.57	9.48		
间隔扩建 工程区	临时措施	防雨布遮盖	m ²	200	0	100
塔基及其 施工临时 占地区	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.24	0.01	0.22
		表土回覆	万 m ³	0.24		0.21
		土地整治	hm ²	6.66	1.60	6.00
	植物措施	撒播草籽	hm ²	0.84	0.33	0.70
	临时措施	土袋挡墙	m/m ³	3362/2521	124/93	3320/2489
		泥浆沉淀池	个	80	0	76
		草垫铺设	hm ²	3.24	0	3.08

		防雨布遮盖	m ²	8400	300	8284
施工道路区	工程措施	土地整治	hm ²	3.12	0.35	2.77
	临时措施	草垫铺设	hm ²	1.50	0	0
		钢板铺垫 (新增)	hm ²	0	0.12	2.09
牵张场区	工程措施	土地整治	hm ²	0.55	0	0
	临时措施	防雨布覆盖	m ²	4000	0	0
		钢板铺垫	m ²		800	800
跨越施工场地区	工程措施	土地整治	hm ²	0.89	0	0
	临时措施	防雨布覆盖	m ²	3000	0	0
电缆沟道及施工临时占地区	工程措施	土地整治	hm ²	0.05	0	0
		表土剥离	万 m ³	0.01	0	0
	临时措施	防雨布覆盖	m ²	500	0	0
水土流失因子	本季度降雨量 (mm)			7 月彭州市 1218.0mm 8 月彭州市 1089.7mm 9 月彭州市 594.6mm		
	最大 24 小时降雨量 (mm)			7 月彭州市 196.5mm 8 月彭州市 259.9mm 9 月彭州市 226.5mm		
	最大风速 (km/h)			7 月彭州市 6.9km/h 8 月彭州市 7.6km/h 9 月彭州市 6.9km/h		
土壤流失量 (t)				278.54	30.21	117.68
水土流失灾害事件				无		
存在问题与建议	(1) 存在问题: 1) 部分塔基施工区域存在建筑垃圾未清理; 2) 部分塔基施工区域存在土石方未摊平; 3) 部分已组塔塔基施工区域植被恢复差。 (2) 建议: 1) 清理塔基施工区域存在建筑垃圾, 进行土地整治、植被恢复; 2) 摊平塔基施工区域存在的土石方, 进行土地整治、植被恢复; 3) 对已组塔塔基施工区域增加撒播草籽密度, 恢复植被。					

1 项目及水土保持工作概况

1.1 项目概况

项目名称：成都官仓 110 千伏变电站第二电源 110 千伏线路工程。

建设单位：国网四川省电力公司成都供电公司。

建设地点：成都彭州市隆丰街道和葛仙山镇。

建设性质：新建、扩建建设类项目。

项目组成：官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程、回龙 220kV 变电站官仓 110kV 间隔改造工程、回龙-官仓 110kV 线路工程（含升高改造 220kV 回云三线）及系统通信工程组成。

项目区附近主要公路有高团路、牡丹大道、S106 省道及若干村间道路。



图 1.1-1 本工程地理位置及路径图

本工程开工时间为 2024 年 1 月，计划竣工时间 2025 年 12 月。2024 年 1 月，四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称“我公司”）负责本工程水土保持监测工作，工程主要特性详见表 1.1-1。

表 1.1-1 成都官仓 110 千伏变电站第二电源 110 千伏线路工程主要特性表

一、项目简介			
项目名称	成都官仓 110kV 变电站第二电源 110kV 线路工程		
工程等级	小型		
工程性质	新建、扩建建设类工程		
建设地点	成都彭州市隆丰街道和葛仙山镇		
建设单位	国网四川省电力公司成都供电公司	工程总投资	3904 万元
建设工期	计划 2023 年 8 月开始施工, 预计于 2024 年 9 月建成, 总工期 14 个月; 工程实际开工日期为 2024 年 1 月, 预计完工时间 2025 年 12 月。		
工程 规 模	变 电 工 程	官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程	在原 110kV 场地扩建一出线间隔, 新增断路器及端子箱基础 1 座, 施工完成后须恢复电缆沟 2m。
		回龙 220kV 变电站官仓 110kV 间隔改造工程	官仓变电站 110kV 间隔接入回龙站原连回 110kV 间隔 (142), 将 142 间隔出线方式由架空出线改为电缆出线, 新建避雷器支架, 电压互感器支架, 电缆终端支架, 避雷器和电压互感器设备利旧。
	线 路 工 程	回龙-官仓 110kV 线路工程	<p>方案阶段: 线路由已建回龙 220kV 变电站 142 号间隔电缆出线至回龙变南侧新建电缆终端塔, 止于 110kV 官仓站 110kV 出线构架; 新建单回线路全线约 21.14km, 其中架空路径长约 21km, 电缆路径长约 0.14km, 曲折系数 1.46, 全线共使用铁塔 81 基, 其中直线塔 41 基, 转角耐张塔 40 基。</p> <p>施工图阶段: 线路由已建回龙 220kV 变电站 142 号间隔电缆出线至回龙变南侧新建电缆终端塔, 止于 110kV 官仓站 110kV 出线构架; 新建单回线路全线约 20950m, 其中架空路径长约 20810m, 电缆路径长约 140m, 曲折系数 1.451, 全线共使用铁塔 80 基, 其中直线塔 39 基, 转角耐张塔 41 基。</p>
	系 统 通 信 工 程		本次沿 110kV 官仓站 ~ 220kV 回龙站 110kV 电力线路路径建设 1 根 48 芯 OPGW+普通光缆, 线路路径总长约 20950m。

1.2 本季度水土保持监测工作概述

2025 年 9 月 2 日~9 月 3 日, 分别收集了施工、监理、业主的水土保持措施进度表和水土保持数据表; 2025 年 9 月 4 日~9 月 5 日, 我公司水土保持技术人员对官仓 110kV 变电站, 已开工塔基、施工道路进行了水土保持现场巡查和调查, 根据现场巡查照片对各单位上报的水土保持措施数量及进度进行了核算, 本季度巡查铁塔 40 基。

2 主体工程进展情况

建设管理单位：国网四川省电力公司成都供电公司

设计单位：四川锦能电力设计有限公司

施工监理：四川东祥工程项目管理有限责任公司

施工单位：四川宏业电力集团有限公司

本工程于 2024 年 1 月开工，截止 2025 年 9 月底，本工程施工进度详述如下：

(1) 变电工程

回龙 220kV 变电站官仓 110kV 间隔改造工程本季度未开始施工，无土建施工，本季度无新增工程量。

经现场调查，官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程 4 月开始施工，本季度无新增土建基础。

(2) 线路工程

截止 2025 年 9 月底，基础开挖累计完成 80 基，本季度新增 3 基；基础浇筑累计完成 80 基，本季度新增 3 基；铁塔组立累计完成 72 基，本季度无新增；本季度已开始架线，已配套设置牵张场 4 处。

3 水土保持监测

3.1 监测分区

根据工程进展情况，本季度回龙 220kV 变电站官仓 110kV 间隔改造工程还未开展土建施工，官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程本季度无新增土建基础；线路工程正处于基础开挖、浇筑、铁塔组立、架线的施工交叉阶段，因此本季度涉及的监测分区为变电站扩建工程区、塔基及其施工临时占地区、施工道路区、牵张场区。按照监测实施方案要求，结合现场监测情况，本季度塔基及其施工临时占地区、施工道路区、牵张场区作为监测重点区。

3.2 监测内容和方法

3.2.1 监测内容

本工程水土保持监测内容包括扰动土地情况监测、弃土（石、渣）情况监测、水土流失情况监测、水土保持措施监测、水土流失灾害事件。

3.2.2 监测方法

3.2.2.1 扰动土地情况监测

（1）变电站间隔扩建工程区

2025 年第 3 季度，通过现场调查，回龙 220kV 变电站官仓 110kV 间隔改造工程本季度未开始进行施工，无土建施工内容，本季度无新增工程量。

经现场调查，官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程本季度无新增土建基础。项目监测人员对施工场地进行了实地量测监测，本季度未新增扰动面积，累计扰动面积 0.01hm²。

（2）塔基及其施工临时占地区

截至 2025 年 9 月底，基础开挖累计完成 80 基，本季度新增 3 基；基础浇筑累计完成 80 基，本季度新增 3 基；铁塔组立累计完成 72 基，本季度无新增；本季度已开始架线，已配套设置牵张场 4 处。

2025 年第 3 季度,本工程新增基础开挖 3 基、新增基础浇筑 3 基,无新增铁塔组立,我公司水土保持技术人员利用无人机进行航飞和现场实地量测相结合的方式监测塔基施工区扰动范围。项目监测人员对本季度进行基础开挖、基础浇筑的 3 基塔基进行无人机航飞和实地量测监测,通过计算分析获得本区域本季度新增扰动土地面积为 0.22hm^2 ,累计扰动面积 6.53hm^2 。相关结果分析见表 3.2-1。

表 3.2-1 2025 年第 3 季度塔基及施工场地新增扰动面积现场监测表

塔号	塔型	基础型式	边长	扰动面积 (m^2)		
				塔基永久面积	塔基施工临时场地面积	合计
N1#	110-EC21D-DJ-18	GZJ12105	8.49	72	662	734
N10#	110-EB21D-ZM1-24	GZZ08065	7.35	54	680	734
N12#	110-EB21D-ZMK-39	BZ2632	9.64	93	629	722
合计				219	1971	2190

(3) 施工道路:本季度新修汽运施工道路 0.435km ,累计修筑 7.835km ,平均宽度 3.5m ,本季度新增扰动地表面积 0.15hm^2 ,累计扰动地表面积 2.74hm^2 ;本季度新修人抬道路 0km ,累计修筑 0km ,累计扰动地表面积 0hm^2 。施工道路区本季度新增扰动地表面积 0.15hm^2 ,累计扰动地表面积 2.74hm^2 。

表 3.2-2 2025 年第 3 季度施工道路新增扰动面积现场监测表

塔号	新建汽运道路情况		
	新建汽运道路长度	宽度	占地面积 (m^2)
N1#	160	3.5	560
N10#	185	3.5	648
N12#	90	3.5	315
合计	435		1523

(4) 电缆沟道及施工临时占地区:电缆部分还未开始施工,本季度无土建施工,本季度无新增工程量。本季度新增扰动地表面积 0hm^2 ,累计扰动地表面积 0hm^2 。

(5) 跨越施工场地区:截至 2025 年 9 月底,本工程不涉及跨越场的布设,本季度新增扰动地表面积 0hm^2 ,累计扰动地表面积 0hm^2 。

(6) 牵张场区,根据现场踏查,截至 2025 年 9 月底,线路工程已配套设置牵张场 4 处,每处牵张场占地面积为 $0.04\text{hm}^2\sim 0.06\text{hm}^2$,本季度新增 0.20hm^2 ,累计扰动地表面积 0.20hm^2 。

(7) 土壤流失面积监测: 经量测, 经现场调查和查阅施工资料获得本季度末各分区硬化面积共计 0.05hm^2 , 本季度新增 0hm^2 。经计算, 本工程累计土壤流失面积为 9.43hm^2 , 其中本季度新增 0.57hm^2 。

表 3.2-3 土壤流失面积监测表

监测分区		扰动面积 (hm^2)		硬化面积 (hm^2)		土壤流失面积 (hm^2)	
		本季度新增	累计	本季度新增	累计	本季度新增	累计
变电工程	官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程区		0.01		0.01		
	小计		0.01		0.01		
线路工程	塔基及其施工临时占地区	0.22	6.53		0.04	0.22	6.49
	施工道路区	0.15	2.74			0.15	2.74
	牵张场区	0.20	0.20			0.20	0.20
	小计	0.57	9.47		0.04	0.57	9.43
合计		0.57	9.48		0.05	0.57	9.43

3.2.2.2 弃土 (石、渣) 情况监测

截止 2025 年第 3 季度, 本工程施工产生土石方开挖约 2.07万 m^3 , 回填 2.00万 m^3 , 临时堆存回填土方 0.07万 m^3 , 其中变电工程开挖约 60m^3 , 已运至站外塔基摊平处理; 线路工程开挖约 2.06万 m^3 , 已回填 2.00万 m^3 , 塔基施工临时场地约有 0.07万 m^3 土石方未摊平; 在施工场地采用防雨布、土袋挡墙对临时堆土进行了临时苫盖、隔离、拦挡。



N20 土石方未摊平



N19 土石方未摊平

3.2.2.3 水土流失情况监测

(1) 监测点位布设：本季度共布设 11 处监测点位：

1) 官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程断路器基础开挖区域布设监测点位 1 处；

2) 塔基及其施工临时占地区：在 N2、N9、N15、N25、N30、N46 塔基及其施工临时占地区各布设 1 处调查监测点位；

3) 施工道路区：在 N25、N30、N65、N66 塔位施工道路场地各布设 1 处调查监测点位。

表 3.2-4 2025 年第 3 季度本工程监测点位布置表

监测分区		监测点位置	数量 (个)	监测方法	备注
变电工程	变电站间隔扩建工程区	官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程断路器基础开挖区域	1	实地调查、查阅资料、无人机监测	固定监测点
线路工程	塔基及其施工临时占地区	N2、N9、N15、N25、N30、N46 塔基及其施工临时占地区各布设 1 处调查监测点位	6	实地调查、查阅资料、无人机监测	固定监测点、巡查点
	施工道路区	N25、N30、N65、N66 塔基的施工道路区域各布设 1 处调查监测点位	4		固定监测点、巡查点

监测分区	监测点位置	数量 (个)	监测方法	备注
小计		11		

(2) 土壤流失量监测

本季度本工程水土流失量见表 3.2-5。

表 3.2-5 2025 年第 3 季度本工程土壤流失量取值表

监测分区	水土流失面积 (hm ²)		土壤侵蚀模数 (t/km ² .a)	时段 (a)	本季度新增土壤流失量 (t)	累计土壤流失量 (t)	
	本季度新增	累计					
变电工程	官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程区	0	0.01		0	0.01	
	小计	0.00	0.01		0.00	0.01	
线路工程	塔基及其施工临时占地	0.22	6.53	1500	0.25	24.49	96.38
	施工道路区	0.15	2.74	800	0.25	5.47	21.04
	牵张场区	0.2	0.2	500	0.25	0.25	0.25
	小计	0.57	9.47			30.21	117.67
合计		0.57	9.48			30.21	117.68

3.2.2.4 水土保持措施监测

根据成都市水务局批复的《成都官仓 110 千伏变电站第二电源 110 千伏线路工程水土保持方案报告书》，本工程拟采取的水土流失防治措施详见表 3.2-6。

表 3.2-6 本工程水土流失防治措施体系一览表

项目	措施类型	措施名称	
变电站间隔扩建区	临时措施	防雨布苫盖	
	临时措施	防雨布苫盖	
线路工程区	工程措施	表土剥离、表土回覆、土地整治	
	植物措施	撒播草籽	
	临时措施	泥浆沉淀池、草垫铺设、土袋挡墙、防雨布苫盖	
	施工道路区	工程措施	土地整治
		临时措施	钢板铺垫
	牵张场区	工程措施	土地整治
		临时措施	防雨布铺垫 钢板铺垫 (新增)
	跨越施工场地区	工程措施	土地整治
		临时措施	防雨布铺垫
电缆沟及其施工临时占地	工程措施	土地整治、表土剥离	
	临时占地	防雨布苫盖	

根据监测组现场监测及查阅施工、监理等相关资料，目前实施的具体水土保持措施及工程量详见表 3.2-7:

表 3.2-7 2025 年第 3 季度水土保持措施实施情况

防治分区	措施类型	措施名称	单位	水土保持方案	2025 年第 3 季度	合计
变电站间隔扩建区	临时措施	防雨布遮盖	m ²	200		100
塔基及其临时占地	工程措施	表土剥离	万 m ³	0.24	0.01	0.22
		表土回覆	万 m ³	0.24		0.21
		土地整治	hm ²	6.66	1.60	6.00
	植物措施	撒播草种	hm ²	0.84	0.33	0.70
	临时措施	泥浆沉淀池	个	80		76
		草垫铺设	hm ²	3.24		3.08
		防雨布遮盖	m ²	8400	300	8284
土袋挡墙		m/m ³	3362/2521	124/93	3320/2489	
施工道路区	工程措施	土地整治	hm ²	3.12	0.35	2.77
	临时措施	草垫铺设	hm ²	1.5		
		钢板铺垫	hm ²		0.12	2.09
牵张场区	工程措施	土地整治	hm ²	0.55		
	临时措施	防雨布覆盖	m ²	4000		
		钢板铺垫	m ²		800	800
跨越施工场地区	工程措施	土地整治	hm ²	0.89		
	临时措施	防雨布覆盖	m ²	3000		
电缆沟和临时占地	工程措施	土地整治	hm ²	0.05		
		表土剥离	万 m ³	0.01		
	临时措施	防雨布覆盖	m ²	500		

3.2.2.5 水土流失灾害性事件

经现场调查,并向施工单位及项目区周边居民咨询,本季度无水土流失灾害性事件。本季度水土保持措施现场调查图片:

(1) 监测点位塔基、监测点位施工道路,官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建工程区现场图



N2



N25



N9



N15



N30



N46



官仓 110kV 变电站回龙 110kV 间隔扩建断路器基础监测点




N25 施工道路



N66 施工道路




N65 施工道路

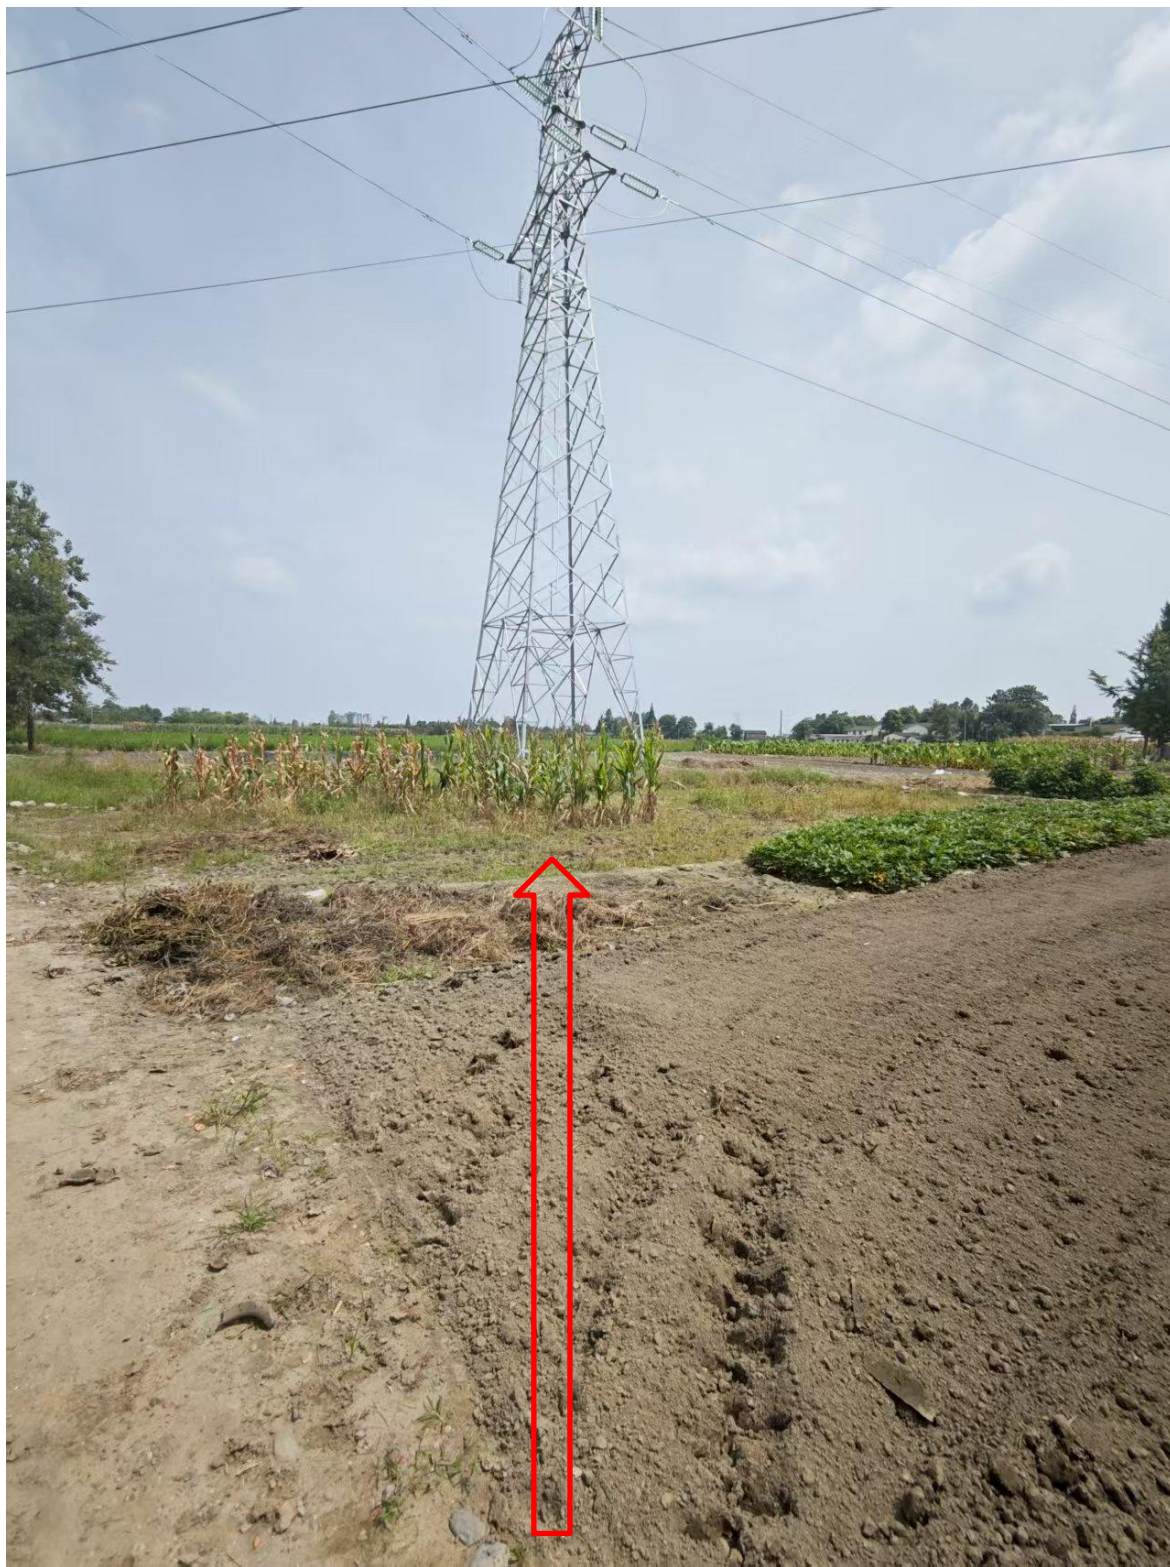

N30 施工道路

(2) 水土保持措施施工照片

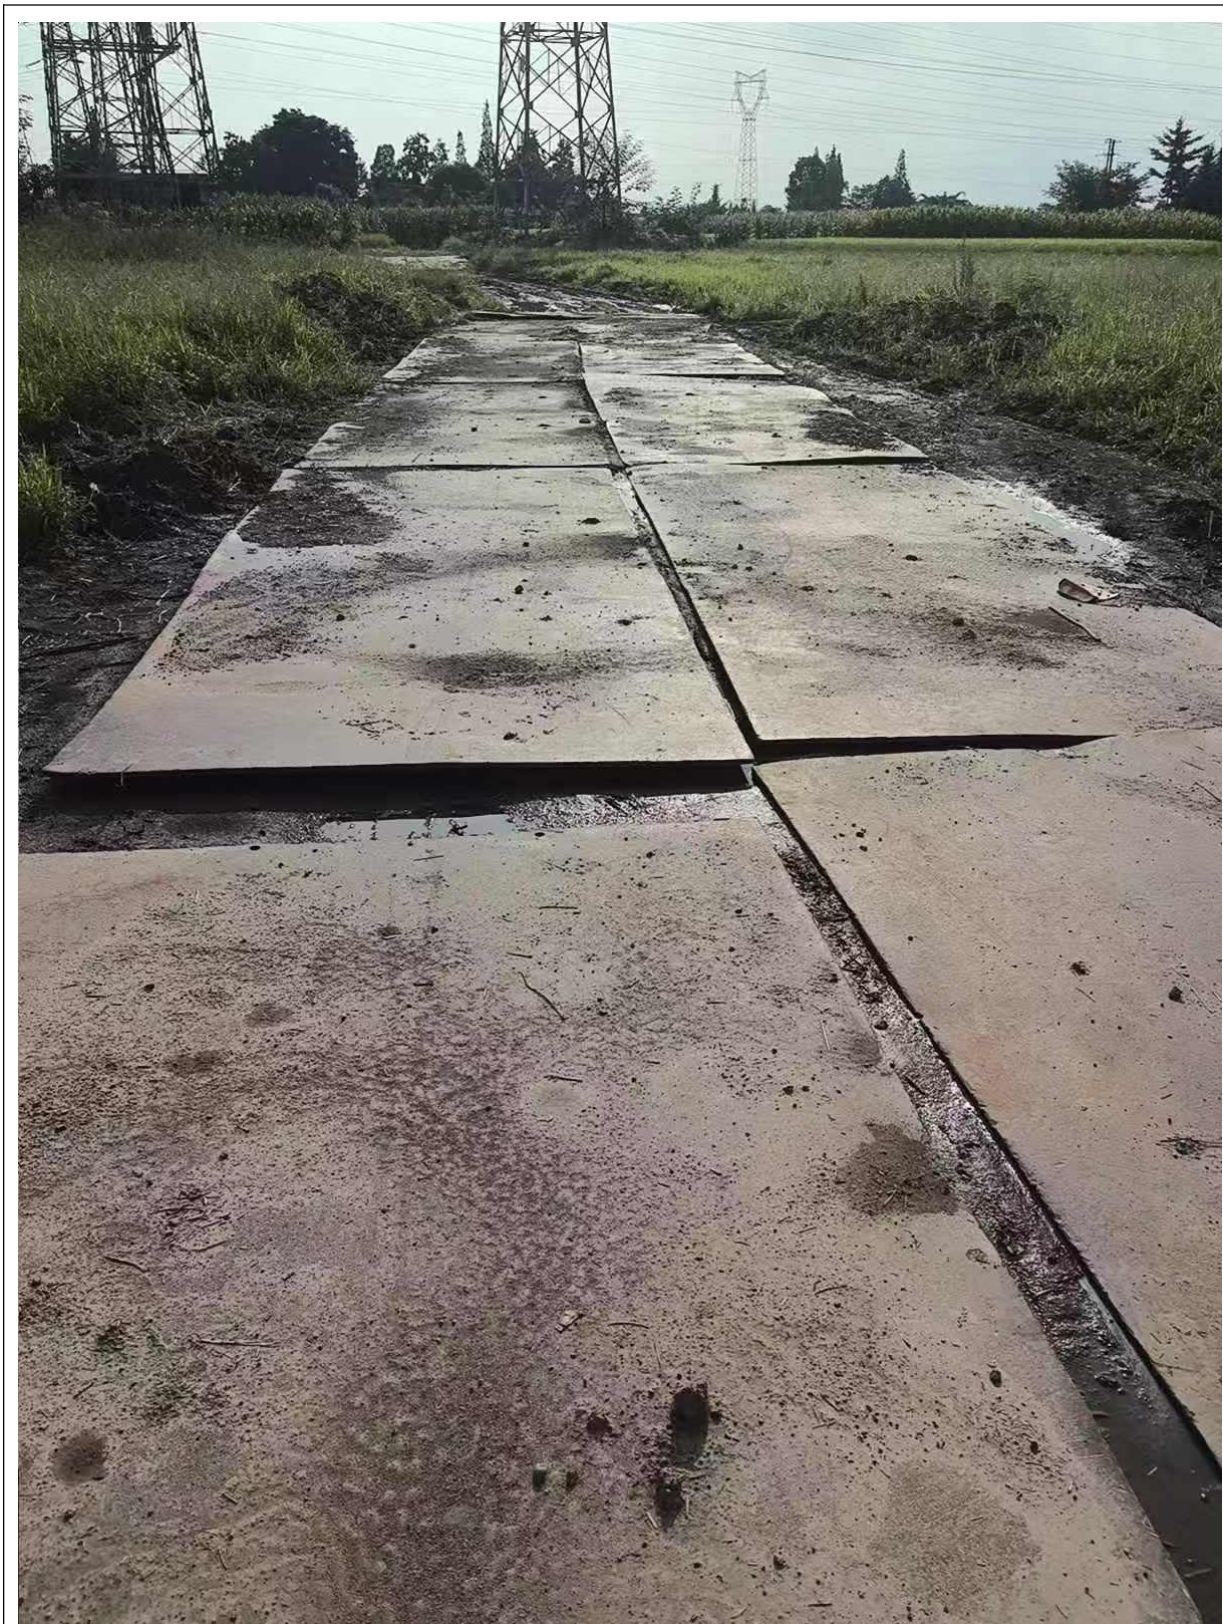

N1 施工道路铺设钢板



N10 施工道路铺设钢板



N59 牵张场铺设钢板



N21 施工道路铺设钢板

(3) 其他施工塔基现场调查照片



N1



N3



N7



N8




N10



N11



N12

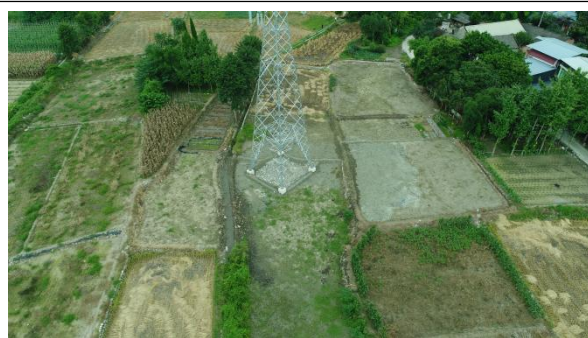

N13



N14











N16





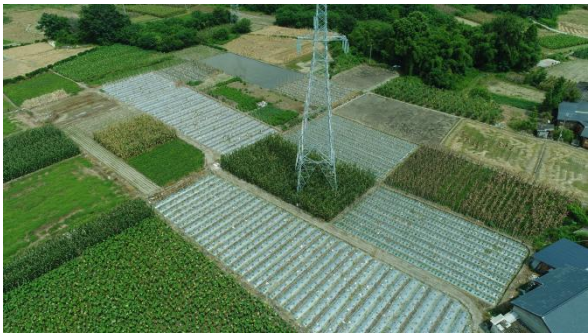



N17



N18

	
N19	N20
	
N26	N27
	
N44	N45
	

N47	N48
	
N49	N59
	
N64	N66
	
N72	N73

	
<p style="text-align: center;">N74</p>	<p style="text-align: center;">N76</p>

4 结论及建议



4.1 上季度整改意见落实情况





根据上一季度水保监测调查发现，上一季度部分施工塔位存在如下问题：

部分塔基永久占地区域植被恢复效果较差，部分塔基施工区域存在土石方未摊平。

针对上述存在的水土保持问题向施工单位项目部提出了整改意见，施工单位项目部根据整改意见对现场问题及时进行了整改，对组塔完成塔基及时进行了土地整治、撒播草籽；部分塔位施工区域存在土石方未摊平。

(1) 整改较好塔基

	
<p>N15 (2025 年第 2 季度) 植被恢复差</p>	<p>N15 (2025 年第 3 季度)</p>

	
<p>N14 (2025 年第 2 季度) 塔基区临时堆土未摊平回填</p>	<p>N14 (2025 年第 3 季度) 塔基区临时堆土已摊平, 但塔基永久占地植被恢复欠佳</p>
	
<p>N7 (2025 年第 2 季度) 塔基区临时堆土未摊平回填</p>	<p>N7 (2025 年第 3 季度) 塔基区临时堆土已摊平</p>

(2) 整改欠佳塔基

	
<p>N19 (2025 年第 2 季度) 塔基施工区域存在堆弃的土石方无遮盖措施、塔基永久占地区域植被恢复差</p>	<p>N19 (2025 年第 3 季度) 塔基施工区域存在堆弃的土石方, 清理土石方、土地整治、恢复植被</p>

	
<p>N20 (2025 年第 2 季度) 塔基施工区域存在堆弃的土石方无遮盖措施</p>	<p>N20 (2025 年第 3 季度) 塔基施工区域存在堆弃的土石方, 清理土石方、土地整治、恢复植被</p>

4.2 结论

(1) 本季度水土保持监测三色评价

通过对项目区扰动土地情况、水土流失状况、防治成效及水土流失危害等监测结果进行汇总和分析: 2025 年第 3 季度 (2025 年 7 月-2025 年 9 月) 水土保持监测三色评价得分 82 分, 评价结论为绿色。水土保持监测三色评价赋分表见附表。

(2) 总体结论

通过现场监测得知, 目前扰动区域主要为塔基及其临时占地区、施工道路区、变电站间隔扩建工程区。在施工过程中各项水土保持措施基本能按照施工进度及时实施。

已实施的水保措施整体运行情况较好, 在项目区保土保水、减少水土流失方面发挥了重要作用。

4.3 存在问题及完善建议

(1) 存在问题:

- 1) 部分塔基施工区域存在建筑垃圾未清理;
- 2) 部分塔基施工区域存在土石方未摊平;
- 3) 部分已组塔塔基施工区域植被恢复差。



N19 塔基施工区域存在堆弃的土石方未摊平、土地整治、恢复植被



N20 塔基施工区域存在堆弃的土石方、土地整治、恢复植被



N45 塔基永久占地区域植被恢复差且施工场地存在建渣垃圾



N13 塔基永久占地区域植被恢复差



N14 塔基永久占地区域植被恢复差



N17 塔基永久占地和施工临时场地区域植被恢复差



N18 塔基永久占地区域植被恢复差



N47 塔基永久占地区域植被恢复差



N48 塔基永久占地区域无植被



N49 塔基永久占地区域无植被恢复

(2) 建议:

- 1) 清理塔基施工区域存在建筑垃圾, 进行土地整治、植被恢复;
- 2) 摊平塔基施工区域存在的土石方, 进行土地整治、植被恢复;
- 3) 对已组塔塔基施工区域增加撒播草籽密度, 恢复植被。

4.4 本项目后期监测工作安排

针对本季度监测发现的问题督促相关单位进行整改, 下一季度(2025 年 10 月-12 月)重点对塔基及其临时占地区、施工道路区的水土保持措施落实情况、施工扰动范围进行监测, 及时将监测季报在国网四川省电力公司官网、业主项目部和施工项目部公示并上报水行政主管部门。

附表：2025 年第 3 季度水土保持监测三色评价赋分表

生产建设项目水土保持监测三色评价及赋分表（试行）

项目名称		成都官仓 110 千伏变电站第二电源 110 千伏线路工程		
监测时段和防治责任范围		2025 年第 3 季度，9.48 公顷		
三色评价		绿色 <input checked="" type="checkbox"/> 黄色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/> .		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	实际产生的扰动面积未超过水土保持方案设计的范围。
	表土剥离保护	5	3	目前施工塔基占用耕地和草地，个别塔基剥离表土、保护不充分
	弃土（石、渣）堆放	15	11	N19、N20 塔位余土未及时摊平
水土流失情况		15	13	根据办水保〔2020〕161 号超过 100hm ² 的生产建设项目，土壤流失量每 100m ³ 扣一分，不足 100m ³ 不扣分；本工程水土保持方案总占地面积为 11.34hm ² ，按土壤流失量每 11.34m ³ 扣一分，不足 11.34m ³ 不扣分，本季度土壤流失量为 22.38m ³ ，扣 2 分。
水土流失防治成效	工程措施	20	16	塔位基础、组塔完成后，部分塔位及施工道路土地整治措施落实不及时
	植物措施	15	11	塔位基础、组塔完成后，部分塔位永久占地区域施工完成后未及时撒播草籽，部分塔位植被恢复差
	临时措施	10	8	现场调查发现基础开挖后、临时遮盖措施未落实
水土流失危害		5	5	未造成水土流失危害
合计		100	82	
