

自贡 II 500 千伏变电站 220 千伏配套工程

水土保持监测季度报告

(2026 年第 3 季度)

建设单位： 国网四川省电力公司自贡供电公司
监测单位： 四川省西点电力设计有限公司

2026 年 9 月



前言

自贡Ⅱ500千伏变电站220千伏配套工程位于四川省自贡市自流井区、沿滩区和富顺县境内，为新建建设类项目，项目组成包括：舒平220kV变电站220kV间隔扩建工程，王渡220kV变电站220kV间隔完善工程，黄市220kV变电站220kV间隔完善工程，自贡Ⅱ~舒平220kV线路工程，自贡Ⅱ~黄市220kV线路工程，洪沟~舒平、洪沟~王渡220kV线路改接工程共6个子项。工程于2026年8月开工，计划2027年12月完工。工程总投资17633万元，其中土建投资2510万元。

2025年5月，建设单位取得四川省发展和改革委员会《关于自贡Ⅱ500千伏变电站220千伏配套工程项目核准的批复》（川发改能源〔2025〕194号）。

2025年11月，建设单位取得国网四川省电力公司《关于自贡Ⅱ500kV变电站220kV配套工程初步设计的批复》（川电建设〔2025〕324号）。

2026年1月，核工业二七〇研究所编制完成《自贡Ⅱ500千伏变电站220千伏配套工程水土保持方案报告书》。2026年1月26日，国网四川省电力公司自贡供电公司取得了四川省水利厅《自贡Ⅱ500千伏变电站220千伏配套工程水土保持方案审批准予行政许可决定书》（川水许可决〔2026〕31号）。

2026年8月起，我公司（四川省西点电力设计有限公司）开展自贡Ⅱ500千伏变电站220千伏配套工程水土保持监测工作。我公司依据《自贡Ⅱ500千伏变电站220千伏配套工程水土保持方案报告书》及水土保持监测相关法律法规要求，对工程2026年8月~9月水土保持情况开展监测，结合现场监测及相关施工、监理资料成果，总结本工程2026年8月~9月水土保持监测结果如下。

目 录

自贡 II 500 千伏变电站 220 千伏配套工程水土保持监测季度报告表	1
1 项目及水土保持工作概况	5
1.1 项目概况	5
1.2 主体工程进展情况	6
2 水土保持监测	7
2.1 监测范围	7
2.2 监测内容	7
2.3 监测方法	7
3 监测结果	10
3.1 扰动地表面积	10
3.2 土壤流失面积	10
3.3 水土流失情况监测	10
3.4 分区情况	11
3.5 水土保持措施实施工程量	13
4 防治措施实施情况分析	15
5 结论及后期实施建议	17

自贡 II 500 千伏变电站 220 千伏配套工程水土保持监测季度报告表

监测时段：2026 年 8 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日

项目名称	自贡 II 500 千伏变电站 220 千伏配套工程				
建设单位联系人及电话	明潇 18281370270	监测项目负责人（签字）： 安绍云	生产建设单位（盖章）： 2026 年 10 月 8 日		
填表人及电话	安绍云 15928547186	2026 年 9 月 30 日			
主体工程进度		工程于 2026 年 8 月开工，计划 2027 年 12 月完工。 截至 2026 年 9 月，自贡 II~黄市 220kV 线路工程基础施工 17 基，其余子项工程未开工。			
指标		设计总量	本季度	累计	
扰动土地面积 (hm ²)	合计		22.81	1.23	
	变电工程区		0.06	0	
	线路工程区	塔基及其施工临时占地区	8.73	0.56	
		施工道路区	11.92	0.67	
		其他施工临时占地区	2.10	0	
弃土（石、渣）量（万 m ³ ）	合计量/弃渣场总数		0	0	
	弃渣场		0	0	
	渣土防护率（%）		92	98	
损坏水土保持设施数量（hm ² ）		22.81	1.23	1.23	
水土保持工程进度	工程措施	排水沟（m）	418		
		挡土墙（m ³ ）	620		
		表土剥离（万 m ³ ）	1.05	0.07	0.07
		表土回覆（万 m ³ ）	1.05		
		土地整治（hm ² ）	22.66		
	植物措施	栽植乔木（株）	3200		
		栽植灌木（株）	15250		
		撒播种草（hm ² ）	11.31		
		临时撒草（hm ² ）	0.54		
		植草地坪（hm ² ）	0.05		
	临时措施	临时排水沟（m）	4992	75	75
		临时沉沙池（个）	62		
		泥浆沉淀池（个）	48		
		土袋拦挡（m）	502	30	30
		临时遮盖（m ² ）	18000	4000	4000
		临时铺垫（m ² ）	85813	650	650
	水土流失影响因素	降雨量（mm）		1028.8	1201.3
最大 24 小时降雨量（mm）		/	/		

	最大风速（m/s）		/	/	/
	最高气温（℃）		42.0	38.0	38.0
	最低气温（℃）		-5.0	20.0	20.0
土壤流失量 （t）	合计		2135.36	6.65	6.65
	变电工程区		0.70	0.00	0.00
	线路工程区	塔基及其施工临时占地区	632.18	2.80	2.80
		施工道路区	1471.61	3.85	3.85
		其他施工临时占地区	30.87	0.00	0.00
水土流失危害事件			无		
存在问题与建议			一、存在问题： （1）部分塔位表土剥离保护不到位，临时堆土、裸露地面苫盖不及时。 （2）部分塔基临时占地机械碾压区域、平缓地新修汽运道路铺垫钢板不及时。 （3）部分塔基、新修汽运道路存在坡面汇水区域临时排水沟、沉沙池实施不到位或不及时。 （4）部分塔位临时堆土和裸露地面苫盖不到位，坡地临时堆土未设土袋拦挡。 二、建议： （1）加强塔基占地、新修汽运道路开挖区域的表土剥离，集中堆放采取防雨布苫盖、土袋拦挡； （2）施工中及时对塔基临时占地机械碾压区域、平缓地新修汽运道路路面铺设钢板保护地表； （3）塔基、新修汽运道路存在坡面汇水区域及时实施临时排水沟、沉沙池； （4）加强临时堆土和裸露地面苫盖措施，坡地临时堆土坡脚及时采取土袋拦挡。		

生产建设项目水土保持监测三色评价及赋分表

项目名称		自贡 II 500 千伏变电站 220 千伏配套工程		
监测时段和防治责任范围		2026 年第 3 季度, 1.23hm ²		
三色评价结论		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动土地情况	扰动范围控制	15	15	施工过程中, 未擅自扩大施工扰动面积, 扰动范围未超方案批复防治责任范围
	表土剥离保护	5	5	表土剥离保护措施未实施面积未达到 1000m ²
	弃土(石、渣)堆放	15	15	工程无需设弃渣场, 无乱堆乱弃顺坡溜渣
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失总量未超 100m ³
水土流失防治成效	工程措施	20	14	水土保持工程措施落实不到位 3 处
	植物措施	15	15	未到植物措施实施阶段
	临时措施	10	4	临时堆土拦挡、遮盖和临时排水不到位 3 处
水土流失危害		5	5	无
合计		100	88	

生产建设项目水土保持监测三色评价赋分方法（试行）

评价指标		分值	赋分方法
扰动土地情况	扰动范围控制	15	擅自扩大施工扰动面积达到 1000 平方米,存在 1 处扣 1 分,超过 1000 平方米的按照其倍数扣分(不足 1000 平方米的部分不扣分)。扣完为止
	表土剥离保护	5	表土剥离保护措施未实施面积达到 1000 平方米,存在 1 处扣 1 分,超过 1000 平方米的按照其倍数扣分(不足 1000 平方米的部分不扣分)。扣完为止
	弃土(石、渣)堆放	15	在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未按规定履行手续的,存在 1 处 3 级以上弃渣场的扣 5 分,存在 1 处 3 级以下弃渣场的扣 3 分;乱堆乱弃或者顺坡溜渣,存在 1 处扣 1 分。扣完为止
水土流失状况		15	根据土壤流失总量扣分,每 100 立方米扣 1 分,不足 100 立方米的部分不扣分。扣完为止
水土流失防治成效	工程措施	20	水土保持工程措施(拦挡、截排水、工程护坡、土地整治等)落实不及时、不到位,存在 1 处扣 1 分;其中弃渣场“未拦先弃”的,存在 1 处 3 级以上弃渣场的扣 3 分,存在 1 处 3 级以下弃渣场的扣 2 分。扣完为止
	植物措施	15	植物措施未落实或者已落实的成活率、覆盖率不达标面积达到 1000 平方米,存在 1 处扣 1 分,超过 1000 平方米的按照其倍数扣分(不足 1000 平方米的部分不扣分)。扣完为止
	临时措施	10	水土保持临时防护措施(拦挡、排水、苫盖、植草、限定扰动范围等)落实不及时、不到位,存在 1 处扣 1 分。扣完为止
水土流失危害		5	一般危害扣 5 分;严重危害总得分为 0

备注: 1.监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和,满分为 100 分。

2.发生严重水土流失危害事件,或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产建设项目,实行“一票否决”,三色评价结论为红色,总得分为 0。

3.上述扣分规则适用超过 100 公顷的生产建设项目;不超过 100 公顷的生产建设项目,各项评价指标(除“水土流失危害”)按上述扣分规则的两倍扣分。

1 项目及水土保持工作概况

1.1 项目概况

- 1、项目名称：自贡 II 500 千伏变电站 220 千伏配套工程
- 2、建设地点：四川省自贡市自流井区、沿滩区和富顺县
- 3、建设单位：国网四川省电力公司自贡供电公司
- 4、建设性质：建设类新建工程
- 5、工程等级：电压等级 220kV，中型工程
- 6、建设内容及规模（共包含 6 个子项工程）：

（1）舒平 220kV 变电站 220kV 间隔扩建工程

扩建 220kV 出线间隔 2 个（6E、9E）。6E 间隔为前期预留间隔，9E 现为旁路间隔，本期改造为出线间隔。将致平线 265（5E）改到 9E 间隔。

（2）王渡 220kV 变电站 220kV 间隔完善工程

将 2 个洪沟间隔更名为舒平，更换间隔内电流互感器和线路侧接地开关，不涉及土建。

（3）黄市 220kV 变电站 220kV 间隔完善工程

完善黄市 220kV 变电站 220kV 间隔 2 个，不涉及土建。

（4）自贡 II~舒平 220kV 线路工程

新建架空线路路径全长 41.302km，其中同塔双回架设 $2 \times 1.623\text{km}$ （自贡 II 侧 $2 \times 0.764\text{km}$ +舒平侧 $2 \times 0.859\text{km}$ ），单回路架设 39.679km（I 线 19.912km+II 线 19.767km）。新建铁塔共 121 基。

拆除致岩~舒平 220kV 线路 164 号大号侧~舒平变段杆塔及导地线，拆除线路长度 0.75km，拆除杆塔共 3 基。

（5）自贡 II~黄市 220kV 线路工程

新建架空线路路径全长 28.775km，其中同塔双回架设 $2 \times 2.054\text{km}$ （自贡 II 侧 $2 \times 1.054\text{km}$ +黄市侧 $2 \times 1\text{km}$ ），单回路架设 26.721km（I 线 13.422km+II 线 13.299km）。新建铁塔共 84 基。

（6）洪沟~舒平、洪沟~王渡 220kV 线路改接工程

新建架空线路长度 4.239km，其中单回线路路径长 2.384km，双回路路径长

2×1.855km。新建铁塔共 27 基。

拆除洪沟~王渡 220kV 二线 5 号小号侧~洪沟变段杆塔及导地线，拆除单回线路长 1.2km，拆除单回路铁塔 4 基，双回路铁 1 基。拆除洪沟~舒平 220kV 南北线原 6 号小号侧~洪沟变段杆塔及导地线，拆除双回线路长 2×1.3km，拆除双回路铁塔 5 基。

7、工程占地及土石方工程量

本工程已批复水土保持方案总占地面积 22.81hm²，其中永久占地 2.63hm²，临时占地 20.18hm²。土石方开挖总量 8.16 万 m³（其中表土剥离 1.05 万 m³），回填总量 7.95 万 m³（含覆土 1.05 万 m³），无借方，产生余方共计 0.21 万 m³，均于塔基永久占地范围内摊平处理。

截至 2026 年 9 月，工程实际扰动土地面积为 1.23hm²，其中：永久占地面积 0.25hm²，临时占地面积为 0.98hm²。

1.2 主体工程进展情况

1.2.1 参建单位

建设单位：国网四川省电力公司自贡供电公司

设计单位：成都城电电力工程设计有限公司

监理单位：四川东祥工程项目管理有限责任公司

施工单位：自贡电力建设集团有限公司输变电工程分公司

水土保持监测单位：四川省西点电力设计有限公司

水土保持设施验收单位：核工业二七 0 研究所

1.2.2 工程施工进度

工程于 2026 年 8 月开工，计划 2027 年 12 月完工。2026 年 9 月，我公司水土保持监测人员开展了现场水土保持监测工作。截至 2026 年 9 月，自贡 II~黄市 220kV 线路工程基础施工 17 基，其余子项工程未开工。

根据现场监测，施工单位对塔基及其施工临时占地区采取了表土剥离、临时排水沟、土袋拦挡、临时苫盖（含临时遮盖、临时铺垫）等措施，对施工道路区采取了表土剥离、临时排水沟、临时苫盖（含临时遮盖、临时铺垫）等措施。

2 水土保持监测

2.1 监测范围

自贡 II 500 千伏变电站 220 千伏配套工程水土保持监测范围以水土流失防治责任范围为准，即为项目建设区。

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018），结合本工程水土保持方案报告书，本工程监测范围分区划分与批复方案水土流失防治分区一致，分为：变电工程区和线路工程区，其中线路工程区二级划分为塔基及其施工临时占地区、施工道路区、其他施工临时占地区。

2.2 监测内容

2.2.1 工程建设进度及扰动面积

根据本项目各分区建设进度情况，核定实际扰动面积，包括项目区永久征占地和施工临时占地面积，确定阶段性建设项目的防治责任范围。

2.2.2 工程土石方量及水土流失情况

本项目阶段性土石方工程量，包括开挖、回填及临时堆土量，余土量。项目区水土流失类型，侵蚀强度，分布特征，危害及影响情况。

2.2.3 水土保持措施实施进度及防治效果

掌握项目区已实施的水土保持措施类型、开（完）工日期、位置、规格尺寸、数量及防治效果等，并根据水土保持设计和现场实际情况，提出相关水土保持措施改进意见和要求。水土保持临时措施防治效果监测包括临时拦渣率、临时覆盖率、临时措施防治面积等。

2.2.4 水土流失危害监测

通过调查分析本项目对周边原始地貌的影响，对周边植被的影响情况进行分析，分析已造成的水土流失危害情况，为水土保持设施验收提供依据。

2.3 监测方法

根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）等相关文件要求，为达到监测目的，本项目的水土流失监测采用了地面监测、调查监测、巡查监测，

并采用无人机辅助监测。

(1) 地面监测

地面监测：是按照不同的土壤侵蚀特点布设水土保持临时监测设施，对施工扰动面形成的水土流失坡面的监测。

在进行水土流失防治动态监测时，对水土保持工程措施和植物措施的监测，采用影像对比作为辅助的监测方法。即使用高分辨率的数码相机和摄像机对水土保持工程措施（包括临时防护措施）进行定点、定期拍照和摄像，通过不同时期影像的对比，监测措施的实施数量、进度、完好程度、运行情况等。同样，采用不同时段影像对比监测不同阶段林草措施的种植面积、成活率、生长情况及覆盖度。此种方法操作简便、经济直观，可为以后水土流失防治效果监测结果分析提供直观的资料。

(2) 调查监测

调查监测是指定期采取全面调查的方式，通过现场实地勘测对地形、地貌、水系的变化进行监测；通过设计资料、监理资料和实地调查（采用 GPS 定位仪、照相机、标杆、尺子等）对土地扰动面积和程度、林草覆盖度、挖填方量、弃土弃渣量、岩土类型和堆放状态（面积、高度、坡长、坡度和堆放时间等）及工程造成危害进行调查，并对水土保持措施实施情况进行测量。

①面积监测：首先对调查项目区按扰动类型进行分区，根据项目进展情况，确定项目的基本扰动情况，依据征地图纸或项目区地形图，采用实地量测（GPS 定位仪、尺子等）和地形图量算相结合的方法，确定扰动面积。

②植被监测：在项目区选项有代表性的地块作为植被调查的标准地，标准地的面积为投影面积。取标准地进行观测并计林草地盖度和覆盖率。计算公式为：

$$D = f_d / f_e \qquad C = f / F$$

式中：

D—林草地的盖度；

C—林草覆盖率，%；

f_d —样方面积， m^2 ；

f_e —样方内草冠垂直投影面积， m^2 ；

f—林草地面积， hm^2 ；

F—类型区总面积， hm^2 。

注：纳入计算的林草地面积，其林草地的覆盖度都应大于 20%。

（3）巡查监测

不定期的进行场地踏勘，若发现水土流失隐患、水土流失危害、较大的扰动类型的变化（如新出现堆渣或堆渣消失、开挖面采取了措施等）等现象，及时通知建设和施工单位采取有效的防治措施并做好监测记录。

（4）无人机监测

利用先进的无人驾驶飞行器技术、遥感传感器技术、遥测遥控技术、通讯技术、GPS 差分定位技术和遥感应用技术，实现自动化、智能化、专用化快速获取空间遥感信息。以监测区域地形、地貌设计航摄方案，利用无人机进行野外航摄，整理航摄范围内航片，通过遥感影像处理软件对影像进行拼接、纠正等处理，得到水土保持监测结果。

3 监测结果

3.1 扰动地表面积

2026 年 9 月，我公司水土保持技术人员现场监测了本工程施工扰动范围。根据施工资料和现场勘察，监测人员通过分析计算，本工程 2026 年第 3 季度末扰动地表面积 1.23hm²，其中本季度新增扰动面积 1.23hm²。

表 3-1 扰动地表面积监测表 单位：hm²

指标		设计总量	本季度	累计
扰动地 表面积	合计	22.81	1.23	1.23
	变电工程区	0.06		0
	线路工程区	塔基及其施工临时占地区	8.73	0.56
		施工道路区	11.92	0.67
		其他施工临时占地区	2.10	0

3.2 土壤流失面积

根据现场监测，本季度末土壤流失面积为 1.23hm²。

表 3-2 土壤流失面积监测表 单位：hm²

指标		本季度监测范围	硬化面积	土壤流失面积
扰动地 表面积	变电工程区	0.00		0.00
	线路工程区	塔基及其施工临时占地区	0.56	0.56
		施工道路区	0.67	0.67
		其他施工临时占地区	0.00	0.00
	合计	1.23	0.00	1.23

3.3 水土流失情况监测

经现场监测工程区水土流失情况分析，结合土壤侵蚀强度分级标准，定量判断分析计算本季度本工程新增水土流失量。

表 3-3 土壤流失量监测计算表

监测分区		本季度监测范围 (hm ²)	硬化面积 (hm ²)	土壤流失面积 (hm ²)	土壤侵蚀模数 (t/km ² .a)	时段 (a)	土壤流失量 (t)
变电工程区		0.00		0.00			0.00
线路工程区	塔基及其施工临时占地区	0.56		0.56	2000	0.25	2.80
	施工道路区	0.67		0.67	2300	0.25	3.85
	其他施工临时占地区	0.00		0.00			0.00
合计		1.23	0.00	1.23			6.65

3.4 分区情况

3.4.1 变电工程区

间隔扩建工程本季度未开工。

3.4.2 线路工程区

3.4.2.1 塔基及其施工临时占地区

本工程共新建铁塔 232 基，于 2026 年 8 月开工，截止 2026 年 9 月，仅自贡 II~黄市 220kV 线路工程施工，已施工塔位 17 基，均在基础施工阶段，其余子项未开工。


塔基及其施工临时占地区采取了表土剥离、临时排水沟、土袋拦挡、临时苫盖（含临时遮盖、临时铺垫）等措施。



自贡 II~黄市 NA27 塔表土剥离、临时苫盖



自贡 II~黄市 NA37 塔表土剥离、临时苫盖

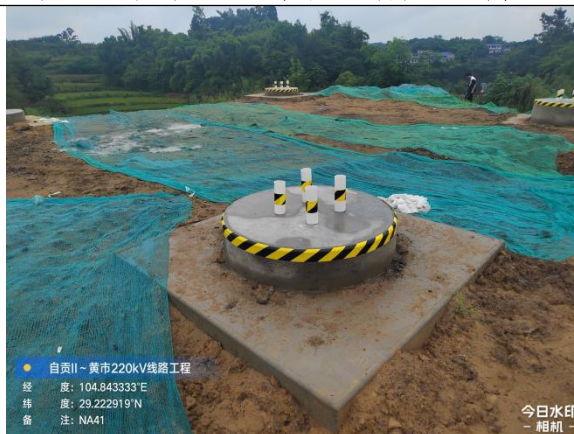

自贡 II~黄市 NA41 塔临时苫盖



自贡 II~黄市 NB27 塔临时苫盖



自贡 II~黄市 NB28 塔表土剥离、临时苫盖、临时排水沟



自贡 II~黄市 NB39 塔表土剥离、临时苫盖



自贡 II~黄市 NB39 塔表土剥离保护



自贡 II~黄市 NB40 塔表土剥离、临时苫盖

3.4.2.2 施工道路区


施工道路区包括汽运道路、人抬道路。施工道路区采取了表土剥离、临时排水沟、临时苫盖（含临时遮盖、临时铺垫）等措施。本季度监测区域如下：



自贡 II~黄市 NA40 汽运道路临时苫盖



自贡 II~黄市 NA41 汽运道路临时苫盖

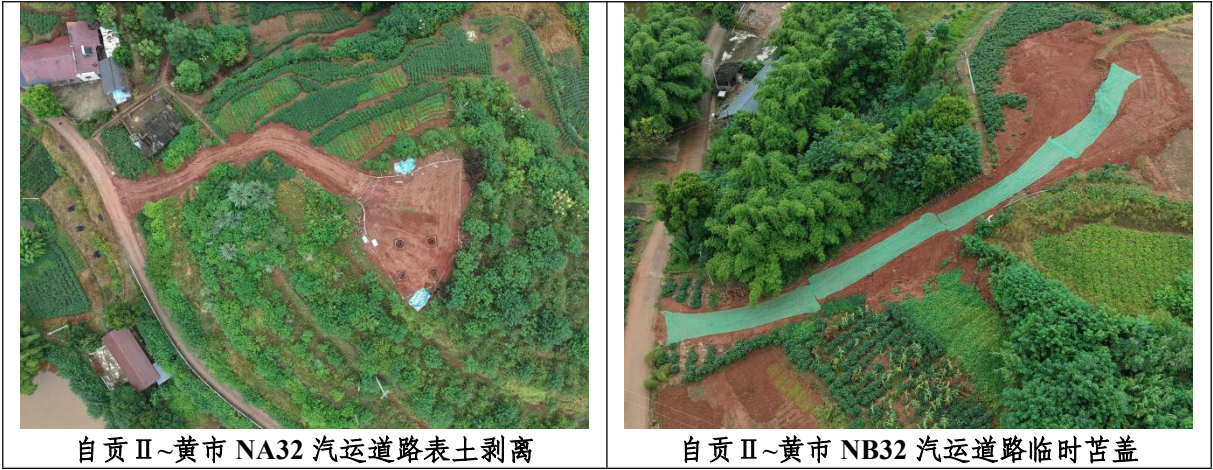

3.4.2.3 其他施工临时占地区

其他施工临时占地区包括牵张场、跨越施工场地、铁塔拆除临时占地。本季度未开工。

3.5 水土保持措施实施工程量

根据现场监测及查阅施工资料，本季度实施的水土保持措施主要有：表土剥离、临时排水沟、土袋拦挡、临时苫盖（含临时遮盖、临时铺垫）等。

主要工程量如下表：

表 3-4 本季度水土保持措施实施工程量表

防治分区	名称	单位	水保方案设计工程量	2026 年III季度
变电工程区	表土剥离	m ³	18	
	表土回覆	m ³	18	
	土地整治	hm ²	0.05	
	植草地坪	hm ²	0.05	
	临时遮盖	m ²	200	
	土袋拦挡	m	20	
塔基及其施工临时占地区	排水沟	m	418	
	挡土墙	m ³	620	
	表土剥离	万 m ³	0.60	0.05
	表土回覆	万 m ³	0.60	
	土地整治	hm ²	8.64	
	栽植灌木	hm ²	2.14	
		株	5350	
	撒播种草	hm ²	5.09	
	临时撒草	hm ²	0.27	
	临时排水沟	m	1872	25
	临时沉沙池	个	38	
	泥浆沉淀池	个	48	

防治分区	名称	单位	水保方案设计工程量	2026 年 III 季度
	土袋拦挡	m	368	30
	临时遮盖	m ²	16800	3400
	临时铺垫	m ²	4000	
施工道路区	表土剥离	万 m ³	0.45	0.02
	表土回覆	万 m ³	0.45	
	土地整治	hm ²	11.92	
	栽植乔木	hm ²	2.88	
		株	3200	
	栽植灌木	hm ²	2.88	
		株	7200	
	撒播种草	hm ²	4.62	
	临时撒草	hm ²	0.27	
	临时排水沟	m	3120	50
	临时沉沙池	个	24	
	土袋拦挡	m	114	
	临时遮盖	m ²	1000	600
	临时铺垫	m ²	67813	650
其他施工临时占地区	土地整治	hm ²	2.10	
	栽植灌木	hm ²	1.08	
		株	2700	
	撒播种草	hm ²	1.60	
	临时铺垫	m ²	14000	


4 防治措施实施情况分析

工程于 2026 年 8 月开工，计划 2027 年 12 月完工。2026 年 9 月，我公司水土保持监测人员开展了现场水土保持监测工作。截至 2026 年 9 月，自贡 II~黄市 220kV 线路工程基础施工 17 基，其余子项工程未开工。

根据现场监测及查阅施工资料，工程建设过程中基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规的要求开展了水土流失防治工作。根据水土保持方案和工程实际情况，随主体工程施工进程逐步落实表土剥离、临时排水沟、土袋拦挡、临时苫盖等水土保持措施，已实施的水土保持措施起到了防治水土流失的效果。但施工中主要存在以下问题：

- (1) 部分塔位表土剥离保护不到位，临时堆土、裸露地面苫盖不及时。
- (2) 部分塔基临时占地机械碾压区域、平缓地新修汽运道路铺垫钢板不及时。
- (3) 部分塔基、新修汽运道路存在坡面汇水区域临时排水沟、沉沙池实施不到位或不及及时。
- (4) 部分塔位临时堆土和裸露地面苫盖不到位，坡地临时堆土未设土袋拦挡。

主要现场调查典型问题如下：

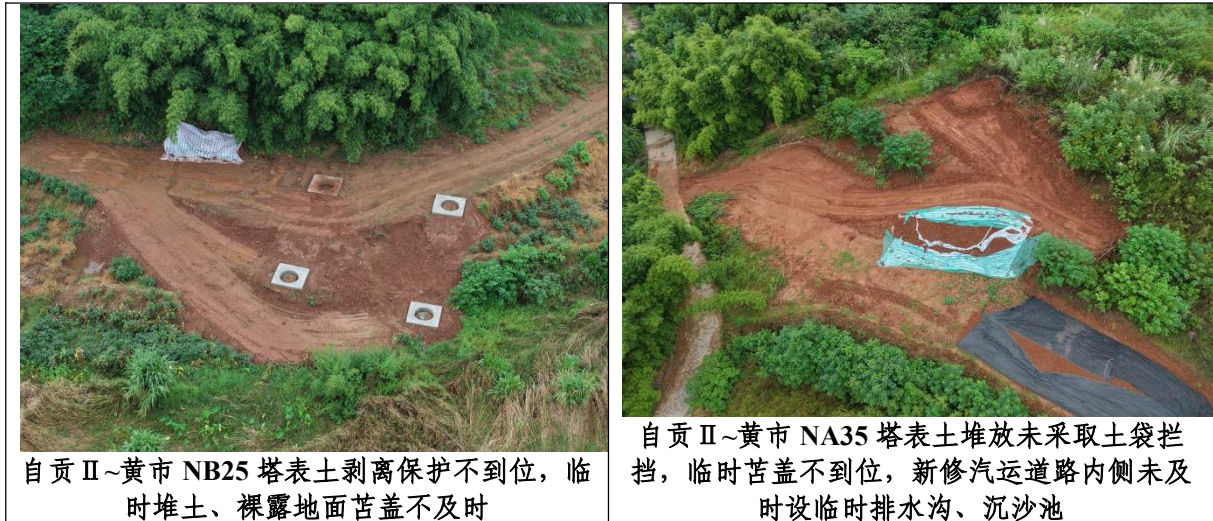

自贡 II~黄市 NB25 塔表土剥离保护不到位，临时堆土、裸露地面苫盖不及时

自贡 II~黄市 NA35 塔表土堆放未采取土袋拦挡，临时苫盖不到位，新修汽运道路内侧未及时设临时排水沟、沉沙池



自贡 II~黄市 NA36 塔表土剥离保护不到位，塔基、新修汽运道路未设临时排水沟、沉沙池，道路挖填坡面未苫盖



自贡 II~黄市 NB29 塔塔基临时占地机械碾压区域、新修汽运道路未铺设钢板，临时堆土、裸露地面苫盖不到位

5 结论及后期实施建议

截至 2026 年 9 月，本工程管理措施基本到位，水土保持监理由主体工程监理一并承担。本工程防治责任范围内已实施的水土保持措施基本达到预期效果，本季度未造成严重水土流失危害。但是建议建设单位加强水土保持施工管理，施工单位应按照已批复的水土保持方案防治措施要求，加强落实水土保持措施，保障工程建设造成的水土流失治理效果。具体建议如下：

（1）加强塔基占地、新修汽运道路开挖区域的表土剥离，集中堆放采取防雨布苫盖、土袋拦挡；

（2）施工中及时对塔基临时占地机械碾压区域、平缓地新修汽运道路路面铺设钢板保护地表；

（3）塔基、新修汽运道路存在坡面汇水区域及时实施临时排水沟、沉沙池；

（4）加强临时堆土和裸露地面苫盖措施，坡地临时堆土坡脚及时采取土袋拦挡。
