

南充仪陇丰南110kV输变电扩建工程

水土保持方案报告表

建设单位： 国网四川省电力公司南充供电公司
编制单位： 四川志德岩土工程有限责任公司

二零二四年八月

南充仪陇丰南110kV输变电扩建工程

水土保持方案报告表

建设单位： 国网四川省电力公司南充供电公司
编制单位： 四川志德岩土工程有限责任公司

二零二四年八月

南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程 水土保持方案报告报告表 资质页

		
统一社会信用代码 915100007653761306	营业执照	
(副本) 副本编号: 12 - 1		扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名称 四川志德岩土工程有限责任公司	注册资本 壹亿元整	
类型 其他有限责任公司	成立日期 2004年09月14日	
法定代表人 敖兵	营业期限 2004年09月14日至 长期	
经营范围 (以下范围不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计、地质勘查、地质灾害治理服务、质检技术服务、测绘服务、地基基础工程、市政公用工程、公路工程、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、石油化工程、特种工程、环保工程, 土石方工程服务; 建筑工程机械与设备租赁; 工程管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	住所 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子北路88号枫丹中心1栋1单元9层909号	
	登记机关	
		2020 年 8 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程
水土保持方案报告报告表
责任页

(四川志德岩土工程有限责任公司)

批 准：敖 兵（法定代表人）

核 定：付 博（总工）

审 查：李 浩（副总工）

校 核：李汉佳（高级工程师）

项目负责人：李 兵（工程师）

编 写：李 兵（工程师）（第 1、2、3 章及附图）

王 双（工程师）（第 4、5、6 章）

黄 涛（助理工程师）（第 7 章及附件）

南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程水土保持方案报告表

项目概况	位置	四川省南充市仪陇县、阆中市		
	建设内容	<p>本工程建设内容包括丰南 110kV 变电站扩建工程（简称丰南变电站扩建工程，下同），八德 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程（简称八德变电站扩建工程，下同），八德—丰南 110kV 线路工程（简称线路工程，下同）。</p> <p>（1）丰南 110kV 变电站扩建工程</p> <p>1) 主变终期规模 3×50MVA，现有规模 2×50MVA(1、2 号)，本期扩建 1×50MVA(3 号)。</p> <p>2) 110kV 终期出线 4 回；现有出线 3 回，至恩阳站 1 回、仪陇站 1 回、高坡站 1 回；本期扩建出线 1 回，至八德站。</p> <p>3) 35kV 终期出线 9 回，现有出线 4 回，本期扩建出线 1 回。</p> <p>4) 10kV 终期出线 24 回，现有出线 16 回，本期扩建出线 1 回。</p> <p>5) 低压无功补偿设备终期 2×(4008+6012)Kvar+2×5004Kvar 现有 2×(4.008+6.012)Kvar，本期扩建新增 3 号主变低压侧 2×5004Kvar。</p> <p>6) 10kV 接地变及消弧线圈成套装置终期 3×630kVA，现有 2×630kVA，本期无。</p> <p>7) 110kV 陇丰线和高丰线进行间隔调换，并更改为电缆出线。</p> <p>（2）八德 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程</p> <p>1) 主变压器：已上 2×180MVA，最终 3×180MVA，本期维持不变；</p> <p>2) 220kV 出线：已上 2 回出线，最终 6 回，本期维持不变；</p> <p>3) 110kV 出线：已上 2 回出线，最终 10 回，本期扩建 1 回；</p> <p>4) 10kV 出线：已上 16 回出线，最终 24 回，本期维持不变。</p> <p>（3）八德—丰南 110kV 线路工程</p> <p>线路起于八德 220kV 变电站，止于丰南 110kV 变电站。新建线路 33.38km，其中架空线路 33.3km，电缆线路 0.08km。</p>		
	建设性质	扩建	总投资（万元）	6351
	土建投资（万元）	1587	占地面积（hm ² ）	永久：1.03 临时：3.77
	动工时间	2024 年 10 月	完工时间	2025 年 12 月
	土石方（万 m ³ ）	挖方	填方	借方
		1.413	1.413	/
	取土（石、砂）场	/		
弃土（石、砂）场	/			
项目区概况	涉及重点防治区情况	嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区	地貌类型	山地、丘陵
	原地貌土壤侵蚀模数[t/(km ² .a)]	1043	容许土壤流失量[t/(km ² .a)]	500
项目选址（线）水土保持评价		<p>根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规定，本工程选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；线路路径已取得了沿线相关部门的路径协议；工程涉及嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区且无法避让，已提高水土流失防治标准等级，执行西南紫色土区一级标准，本方案根据工程实况进一步完善水土保持措施布设、优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，加强防护、治理措施，提高林草覆盖率，能够达到水土保持相关要求，因此，经本方案补充完善后，主体工程选址（线）不存在水土保持制约性因素。</p>		
预测水土流失总量		595.2t		
防治责任范围（hm ² ）		4.80		
防治标准等级及目标	防治标准等级	西南紫色土区一级		
	水土流失治理度(%)	97	土壤流失控制比	1.0
	渣土防护率(%)	92	表土保护率(%)	92
	林草植被恢复率(%)	97	林草覆盖率(%)	25
水土保持措施	(1) 丰南变电站扩建工程 1) 站区			

<p>临时措施：彩条布苫盖 500m²。</p> <p>(2) 八德变电站扩建工程</p> <p>1) 站区</p> <p>临时措施：彩条布苫盖 100m²。</p> <p>(3) 线路工程</p> <p>1) 塔基区</p> <p>工程措施：浆砌石排水沟（断面尺寸上底宽×下底宽×高=0.5m×0.4m×0.5m）100m、11m³，表土剥离及回覆 0.58hm²、0.12 万 m³，土地整治 0.56hm²、耕地恢复 0.37hm²。</p> <p>植物措施：撒播草籽 0.56hm²、45kg。</p> <p>临时措施：彩条布苫盖 2000m²，彩条布铺垫 500m²，植生袋拦挡 30m³。</p> <p>2) 塔基施工场地区</p> <p>工程措施：土地整治 1.30hm²、耕地恢复 0.87hm²。</p> <p>植物措施：撒播草籽 1.30hm²、104kg。</p> <p>临时措施：铺设彩条布 800m²。</p> <p>3) 牵张场区</p> <p>工程措施：土地整治 0.17hm²、耕地恢复 0.11hm²。</p> <p>植物措施：撒播草籽 0.17hm²、14kg，栽植灌木 204 株。</p> <p>临时措施：彩条布铺垫 200m²。</p> <p>4) 施工道路区</p> <p>工程措施：表土剥离及回覆 0.18hm²、0.03 万 m³，土地整治 0.79hm²、耕地恢复 0.53hm²。</p> <p>植物措施：撒播草籽 0.79hm²、63kg，栽植灌木 948 株。</p> <p>临时措施：彩条布苫盖 300m²，植生袋拦挡 15m³，临时排水沟（断面尺寸上底宽×下底宽×高=0.5m×0.3m×0.3m）48m、6m³。</p>				
水土保持投资估算 (万元)	工程措施 (万元)	14.01	植物措施 (万元)	11.71
	临时措施 (万元)	4.87	水土保持补偿费 (万元)	6.24
	独立费用 (万元)	建设管理费	0.59	
		水土保持监理费	5.00	
		水土保持验收报告编制费	4.00	
		科研勘测设计费	8.00	
总费用 (万元)	56.77			
编制单位	四川志德岩土工程有限责任公司	建设单位	国网四川省电力公司南充供电公司	
法人代表及电话	敖兵, 028-85720672	法人代表及电话	曹海泉	
地址	成都市高新区交子北一路 88 号丹枫中心 1 栋 1 单元 9 层 909 号	地址	南充市涪江路 228 号	
邮编	610041	邮编	637000	
联系人及电话	刘小龙 13220871223	联系人及电话	王舰 13890807677	
电子邮箱	/	电子邮箱	/	
传真	/	传真	/	

目 录

1. 综合说明	1
1.1. 项目简况	1
1.2. 编制依据	3
1.3. 设计水平年	4
1.4. 水土流失防治责任范围	4
1.5. 水土流失防治目标	4
1.6. 项目水土保持评价结论	6
1.7. 水土流失预测结果	7
1.8. 水土保持措施布设成果	7
1.9. 水土保持监测方案	8
1.10. 水土保持投资及效益分析成果	9
1.11. 结论	9
2. 项目概况	10
2.1. 项目组成及工程布置	10
2.2. 施工组织	18
2.3. 工程占地	22
2.4. 土石方平衡	23
2.5. 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	27
2.6. 施工进度	27
2.7. 自然概况	27

3. 项目水土保持评价	33
3.1. 主体工程选址（线）水土保持评价	33
3.2. 建设方案与布局水土保持评价	35
3.3. 主体工程设计中水土保持措施界定	38
4. 水土流失分析与预测	39
4.1. 水土流失现状	39
4.2. 水土流失影响因素分析	39
4.3. 土壤流失量预测	40
4.4. 水土流失危害分析	42
4.5. 指导性意见	43
5. 水土保持措施	44
5.1. 防治区划分	44
5.2. 措施总体布局	45
5.3. 分区措施布设	48
6. 水土保持监测	53
7. 水土保持投资估算及效益分析	54
7.1. 投资估算	54
7.2. 效益分析	59
8. 水土保持管理	61
8.1. 组织管理	61

8.2. 后续设计	62
8.3. 水土保持监测	62
8.4. 水土保持监理	62
8.5. 水土保持施工	63
8.6. 水土保持设施后续管理	63

附件：

- 附件 1 委托书
- 附件 2 可研批复
- 附件 3 核准批复
- 附件 4 专家意见

附图：

- 附图 1 地理位置图
- 附图 2 丰南变电站总平面布置图
- 附图 3 八德变电站总平面布置图
- 附图 4 线路工程路径图
- 附图 5 铁塔一览图
- 附图 6 铁塔基础图

1. 综合说明

1.1. 项目简况

1.1.1. 项目基本情况

仪陇县位于南充市东北部，面积 1791km²，人口约 106 万。截至 2022 年底，仪陇县电网共有 220kV 公用变电站 1 座，变电容量 300MVA；110kV 公用变电站 5 座，变电容量 381.5MVA。2022 年仪陇县电网最大负荷 285MW。

仪陇县西北部目前由丰南 110kV 变电站（2×50MVA）供电，2022 年丰南站最大负荷 87MW，预计 2025 年最大负荷将达到 105MW。为满足片区负荷发展需求，提高供电可靠性，结合南充电网发展规划，建设南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程是必要的。

南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程位于四川省南充市仪陇县、阆中市，属于扩建建设类项目。主要建设内容包括丰南 110kV 变电站扩建工程（简称丰南变电站扩建工程，下同），八德 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程（简称八德变电站扩建工程，下同），八德—丰南 110kV 线路工程（简称线路工程，下同），位于四川省南充市仪陇县、阆中市。

（1）丰南 110kV 变电站扩建工程

本期工程在现有围墙内扩建。本期扩建 1×50MVA（3 号），本期扩建 110kV 出线 1 回，35kV 出线 1 回，10kV 出线 1 回，新增 3 号主变低压侧 2×5004Kvar，110kV 陇丰线和高丰线进行间隔调换，并更改为电缆出线。

（2）八德 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程

本期工程在现有围墙内扩建，110kV 出线本期扩建 1 回。

（3）八德—丰南 110kV 线路工程

线路起于八德 220kV 变电站，止于丰南 110kV 变电站。新建线路 33.38km，其中架空线路 33.3km，电缆线路 0.08km。

本工程总占地 4.80hm²，其中仪陇县为 2.05hm²、阆中市为 2.75hm²。按占地性质划分，其中永久占地 1.03hm²、临时占地 3.77hm²。按占地类型划分，其中耕地 1.18hm²、园地 0.71hm²、林地 2.84hm²、公共管理与公共服务用地 0.07hm²。

本工程挖填方 2.826 万 m³，其中挖方 1.413 万 m³（表土剥离 0.15 万 m³），填

方 1.413 万 m³（表土回覆 0.15 万 m³），无外弃方和借方。

本工程总投资 6351 万元，其中土建投资 1587 万元；计划于 2024 年 10 月开工，2025 年 12 月建成投产，总工期 15 个月。

1.1.2. 项目前期工作进展情况

2023 年 11 月，四川南充电力设计有限公司编制完成《南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程可行性研究报告》。

2024 年 1 月，国网四川省电力公司以《国网四川省电力公司关于南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程可行性研究报告的批复》（川电发展〔2024〕28 号）对该工程可研进行了批复。

2024 年 3 月，南充市发展和改革委员会以《南充市发展和改革委员会关于核准南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程项目核准的批复》（南发改审批〔2024〕8 号）对该工程进行了批复。

2024 年 6 月，四川南充电力设计有限公司编制完成《南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程初步设计报告》。

受国网四川省电力公司南充供电公司委托开展本项目水土保持方案的编制工作。接受委托后，我公司方案编制组对本项目进行现场调查和实地踏勘，调查分析，结合工程生产建设特点，特别是生产建设中对地表的占压、再造和扰动状况，依照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等规范、文件要求，界定了本工程水土流失防治责任范围和防治分区，对工程建设可能产生的水土流失及危害进行预测，并制定了相应的分区防治措施和实施进度计划，对水土保持方案投资进行估算，于 2024 年 8 月编制完成了《南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程水土保持方案报告表》。

1.1.3. 自然概况

项目区为山丘区，属于亚热带湿润季风气候，一年分为干季和湿季两季，干季从 11 月至翌年 4 月，湿季从 5 月至 10 月。多年平均气温 16.9~17.6℃，≥10℃积温 5421~5444.6，多年平均降水量 1043~1081.6mm，多年平均蒸发量 1026.5~1275mm，无霜日数 301~303d，多年平均风速 1.2~1.6m/s，多年平均相对湿度 78~82%。项目区属长江水利委员会管理，只涉及小河沟及堰塘。土壤以水稻土、紫色土和黄壤土为主，属亚热带常绿阔叶林区，林草覆盖率为 30~40%。仪陇县和阆中

市属于全国水土保持区一级区西南紫色土区，属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度为轻度侵蚀，容许土壤流失量为 $500t/(km^2 \cdot a)$ ，项目区原地貌侵蚀模数为 $1043t/(km^2 \cdot a)$ 。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等。

1.2. 编制依据

1.2.1. 法律法规

(1) 《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议通过，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2011年3月1日施行）；

(2) 《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（四川省人大常委，1993年12月15日通过，1997年10月17日修正，2014年6月21日修订，2012年12月1日施行）；

(3) 《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）。

1.2.2. 技术标准

(1) 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

(2) 《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

(3) 《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

(4) 《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

(5) 《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

(6) 《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

(7) 《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）；

(8) 《防洪标准》（GB 50201-2014）；

(9) 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

(10) 《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

(11) 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

(12) 《关于颁发<水土保持工程概（估）算编制规定和定额的通知>》（水利部水总[2003]67号文）。

1.2.3. 技术资料

(1) 《南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程可行性研究报告》（四川南充电力设计有限公司，2023 年 11 月）；

(2) 《南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程》可研评审意见及批复；

(3) 《南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程初步设计报告》（四川南充电力设计有限公司，2024 年 6 月）。

1.3. 设计水平年

方案设计水平年为主体工程完工后的当年或后一年，本工程建设期计划为 2024 年 10 月至 2025 年 12 月，水土保持方案设计水平年为 2026 年。

1.4. 水土流失防治责任范围

根据项目区周围的自然环境，水土流失状况以及输变电工程建设特点，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，确定本工程水土保持防治责任范围为项目建设区，项目建设区包括工程永久占地及临时占地。

本工程水土流失防治责任范围面积 4.80hm²，详见表 1.4-1。

表 1.4-1 本项目水土流失防治责任范围 hm²

项目		占地类型				占地性质		合计
		耕地	园地	林地	公共管理与公共服务用地	永久占地	临时占地	
1	仪陇县	0.50	0.30	1.19	0.06	0.47	1.58	2.05
丰南变电站扩建工程	站区				0.06	0.06		0.06
	小计				0.06	0.06		0.06
线路工程	塔基区	0.10	0.06	0.25		0.41		0.41
	塔基施工场地区	0.23	0.14	0.55			0.92	0.92
	牵张场区	0.03	0.02	0.07			0.12	0.12
	施工道路区	0.14	0.08	0.32			0.54	0.54
	小计	0.50	0.30	1.19		0.41	1.58	1.99
2	阆中市	0.68	0.41	1.65	0.01	0.56	2.19	2.75
八德变电站扩建工程	站区				0.01	0.01		0.01
	小计				0.01	0.01		0.01
线路工程	塔基区	0.14	0.08	0.33		0.55		0.55
	塔基施工场地区	0.31	0.19	0.75			1.25	1.25
	牵张场区	0.04	0.02	0.10			0.16	0.16
	施工道路区	0.19	0.12	0.47			0.78	0.78
	小计	0.68	0.41	1.65		0.55	2.19	2.74
合计		1.18	0.71	2.84	0.07	1.03	3.77	4.80

1.5. 水土流失防治目标

1.5.1. 执行标准等级

本工程属于建设类项目，在四川省南充市仪陇县、阆中市境内建设。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点治理区和重点预防区复核划分成果》（办水保[2013]188号）、《四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（川水函〔2017〕482号）等中相关规定，仪陇县、阆中市属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。

根据《全国水土保持区划》（试行）、《四川省水土保持规划（2015-2030年）》等中相关规定，项目区属于西南紫色土区。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中相关规定，本工程水土流失防治执行西南紫色土区一级防治标准。

1.5.2. 防治目标

（1）水土流失防治基本目标

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中规定，生产建设项目水土流失防治应达到下列基本目标：

- 1) 项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；
- 2) 水土保持设施应安全有效；
- 3) 水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）。

（2）水土流失防治六项指标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中相关规定，本方案考虑对土壤流失控制比、林草覆盖率进行调整，具体如下：

1) 土壤流失控制比调整

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）相关规定，本方案对土壤流失控制比进行适当调整，本工程水土流失以轻度水力侵蚀为主，因此本方案考虑对土壤流失控制比调整为 1.00。

2) 林草覆盖率调整

本项目属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，根据《生产建

设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中 3.2 章节规定，本工程林草覆盖率考虑提高 2%。

本工程水土流失防治标准详见表 1.5-1。

表 1.5-1 本工程水土流失防治标准

防治标准	行政区			防治指标	标准指标值		采用指标值	
					施工期	设计水平年	施工期	设计水平年
西南紫色土区一级	四川省	南充市	仪陇县、阆中市	水土流失治理度（%）	-	97	-	97
				土壤流失控制比	-	0.85	-	1.00
				渣土防护率（%）	90	92	90	92
				表土保护率（%）	92	92	92	92
				林草植被恢复率（%）	-	97	-	97
				林草覆盖率（%）	-	23	-	25

1.6. 项目水土保持评价结论

1.6.1. 主体工程选址（线）评价

通过与《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》等相关规定，本工程选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；线路路径已取得了沿线相关部门的路径协议；项目区属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区且无法避让，提高水土流失防治标准等级，执行西南紫色土区一级标准，本方案根据工程实况进一步完善水土保持措施布设、优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，提高工程防护标准，加强防护、治理措施，提高林草覆盖率，能够达到水土保持相关要求。综合分析，主体工程选址（线）经本方案补充完善后不存在水土保持约束性。

1.6.2. 建设方案与布局评价

变电站扩建工程在站区预留场地内扩建，进站道路、站外电源、站外供排水设施等可利用前期工程已有设施，减少了占地、土石方开挖和回填。线路塔基位于山丘区，工程设计方案中塔基采用了不等高基础，线路采用掏挖基础、挖孔基础等基础，基础土石方开挖量较少，对地表破坏较少。线路方案布设考虑沿线交通条件、施工条件等，采用无人机等先进施工放线工艺，充分利用已有道路等，有效减少工程占地和土石方开挖和回填。综合分析，本工程建设方案与布局经本方案补充完善后不存在水土保持约束性。

1.7. 水土流失预测结果

本工程扰动土地面积 4.80hm²，损毁植被面积 3.55hm²。工程建设在不采取水土保持措施时，可能产生水土流失量 595.2t，新增土壤流失量 433.0t。施工期是水土流失的重点时段，线路工程塔基区、施工道路区是水土流失的重点区域，也是本工程治理的重点区域。

1.8. 水土保持措施布设成果

结合本工程水土流失特点及后续管护的需求，本工程水土流失防治分区划分为丰南变电站扩建工程、八德变电站扩建工程、线路工程 3 个一级防治分区；丰南变电站扩建工程划分为站区 1 个二级防治分区，八德变电站扩建工程划分为站区 1 个二级防治分区，线路工程划分为塔基区、塔基施工场地区、牵张区、施工道路区 4 个二级防治分区。

(1) 丰南变电站扩建工程

1) 站区

施工过程中，对临时堆土进行彩条布苫盖。

临时措施：彩条布苫盖 500m²。

(2) 八德变电站扩建工程

1) 站区

施工过程中，对临时堆土进行彩条布苫盖。

临时措施：彩条布苫盖 100m²。

(3) 线路工程

1) 塔基区

施工前，对塔基开挖区域进行表土剥离，堆放在塔基施工场地；施工场地铺彩条布。施工过程中，对临时堆土周边采用植生带拦挡和彩条布苫盖；有汇水区域的塔基周围布设浆砌石排水沟接入周边沟道。施工后期，施工区回覆表土、土地整治、耕地恢复、撒播草籽。

工程措施：浆砌石排水沟（断面尺寸上底宽×下底宽×高=0.5m×0.4m×0.5m）100m、11m³，表土剥离及回覆 0.58hm²、0.12 万 m³，土地整治 0.56hm²、耕地恢复 0.37hm²。

植物措施：撒播草籽 0.56hm²、45kg。

临时措施：彩条布苫盖 2000m²，彩条布铺垫 500m²，植生袋拦挡 30m³。

2) 塔基施工场地区

施工过程中采取彩条布铺垫措施；施工结束后采取土地整治、耕地恢复、撒播草籽。

工程措施：土地整治 1.30hm²、耕地恢复 0.87hm²。

植物措施：撒播草籽 1.30hm²、104kg。

临时措施：铺设彩条布 800m²。

3) 牵张场区

施工前，牵张场铺设棕垫，跨越施工场地铺垫彩条布。施工后期，进行土地整治，原耕地复耕，其他土地栽植灌木和撒播草籽。

工程措施：土地整治 0.17hm²、耕地恢复 0.11hm²。

植物措施：撒播草籽 0.17hm²、14kg，栽植灌木 204 株。

临时措施：彩条布铺垫 200m²。

4) 施工道路区

机械运输道路开挖前，进行表土剥离，并对剥离的表土植生带拦挡和彩条布苫盖；机械运输道路施工过程中设置临时排水沟进行临时防护；施工结束后进行表土回覆、土地整治、耕地恢复、植被恢复措施。

工程措施：表土剥离及回覆 0.18hm²、0.03 万 m³，土地整治 0.79hm²、耕地恢复 0.53hm²。

植物措施：撒播草籽 0.79hm²、63kg，栽植灌木 948 株。

临时措施：彩条布苫盖 300m²，植生袋拦挡 15m³，临时排水沟（断面尺寸上底宽×下底宽×高=0.5m×0.3m×0.3m）48m、6m³。

1.9. 水土保持监测方案

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），对编制水土保持方案报告书的生产建设项目（即征占地面积在 5hm² 以上或者挖填土石方总量 5 万 m³ 以上的生产建设项目），生产建设单位应当自行或者委托具有相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。本项目征占地总面积为 4.80hm²，项目土石方挖填总量为 2.826 万 m³ 需编

水土保持方案报告表。因此，本项目可不开展水土保持专项监测工作。但建设单位应落实水土流失防治责任和义务，加强水土保持工程实施过程中的管理和后期管护，对工程施工过程可能造成水土流失的区域进行必要的自主监测，为项目竣工验收提供依据。

1.10. 水土保持投资及效益分析成果

本工程水土保持总投资 56.77 万元，主体已列 1.21 万元，方案新增 55.56 万元。新增投资中工程措施 12.80 万元、植物措施 11.71 万元、临时措施 4.87 万元、独立费用 17.59 万元、基本预备费 2.35 万元、水土保持补偿费 6.24 万元。

水土保持工程方案实施后，可治理水土流失面积 4.79hm²、林草植被建设面积 2.81hm²、可减少土壤流失量 433.0t、渣土挡护量 1.403 万 m³、表土剥离及保护量 0.149 万 m³。设计水平年水土流失治理度达到 99.8%，土壤流失控制比为 1.0，渣土防护率可达到 99.3%，表土保护率可达到 99.3%，林草植被恢复率可达到 99.6%，林草覆盖率达到 58.5%，防治效果达到防治目标的要求。

1.11. 结论

通过水土保持分析论证，完善水土流失防治体系后，项目建设无水土保持制约性因素；各项水土保持措施落实后，能有效防止或减少新增水土流失，实现项目建设区环境的恢复和改善。因此，从水土保持角度分析，本工程建设是可行的。

本方案经批准后，建设地点、规模发生重大变化或水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更时，建设单位要组织补充或修改水土保持方案报原审批机关批准。

工程下阶段设计时进一步细化水土保持措施，并对线路工程路径优化。

招标时明确承包商承担防治水土流失的责任、义务。

施工时施工单位应做好施工期间的水土流失防治措施。

监理单位应对水土保持措施进行全过程的监督管理。

建设单位待水土保持方案批复后，及时足额缴纳水土保持补偿费。

建设单位应依据防治目标，组织相关单位进行完善和改进，达到方案要求。

2. 项目概况

2.1. 项目组成及工程布置

工程名称：南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程

建设单位：国网四川省电力公司南充供电公司

建设地点：四川省南充市仪陇县、阆中市

工程建设性质：扩建

工程等级：110kV

工程建设内容：

(1) 丰南 110kV 变电站扩建工程

本期工程在现有围墙内扩建，本期扩建 1×50MVA 主变，扩建 1 个 110kV 出线间隔，扩建 1 个 35kV 出线间隔，扩建 1 个 10kV 出线间隔，扩建主变低压侧装设 2 组 5Mvar 无功补偿电容器组。

(2) 八德 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程

本期工程在现有围墙内扩建，本期扩建 1 个 110kV 出线间隔至丰南。

(3) 八德—丰南 110kV 线路工程

线路起于八德 220kV 变电站，止于丰南 110kV 变电站。新建线路 33.38km，其中架空线路 33.3km，电缆线路 0.08km。

工程总投资：总投资 6351 万元，其中土建投资 1587 万元。

工程建设期：15 个月（2024 年 10 月~2025 年 12 月）

工程特性详见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目基本组成及工程特性表

一、项目的基本情况							
1	项目名称	南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程					
2	建设地点	丰南变电站扩建工程	四川省南充市仪陇县日兴镇白塔村四组				
		八德变电站扩建工程	四川省南充市阆中市宝马镇一村八社				
		线路工程	四川省南充市仪陇县、阆中市				
3	建设单位	国网四川省电力公司南充供电公司					
4	建设性质	扩建					
5	工程等级	110kV					
6	建设工期	2024 年 10 月~2025 年 12 月					
7	工程投资	总投资 6351 万元，其中土建投资 1587 万元。					
8	工程占地	工程总占地面积为 4.80hm ² ，其中永久占地 1.03hm ² 、临时占地 3.77hm ² 。					
9	占地类型	耕地、园地、林地、公共管理与公共服务用地					
7	建设规模	丰南变电站扩建工程	(1) 主变终期规模 3×50MVA，现有规模 2×50MVA (1、2 号)，本期扩建 1×50MVA (3 号)。 (2) 110kV 终期出线 4 回；现有出线 3 回，至恩阳站 1 回、仪陇站 1 回、高坡站 1 回；本期扩建出线 1 回，至八德站。 (3) 35kV 终期出线 9 回，现有出线 4 回，本期扩建出线 1 回。 (4) 10kV 终期出线 24 回，现有出线 16 回，本期扩建出线 1 回。 (5) 低压无功补偿设备终期 2×(4008+6012)Kvar+2×5004Kvar 现有 2×(4.008+6.012)Kvar，本期扩建新增 3 号主变低压侧 2×5004Kvar。 (6) 10kV 接地变及消弧线圈成套装置终期 3×630kVA，现有 2×630kVA，本期无。 (7) 110kV 陇丰线和高丰线进行间隔调换，并更改为电缆出线。				
		八德变电站扩建工程	(1) 主变压器：已上 2×180MVA，最终 3×180MVA，本期维持不变； (2) 220kV 出线：已上 2 回出线，最终 6 回，本期维持不变； (3) 110kV 出线：已上 2 回出线，最终 10 回，本期扩建 1 回； (4) 10kV 出线：已上 16 回出线，最终 24 回，本期维持不变。				
		线路工程	电压等级	110kV			
			线路长度	新建线路 33.38km，其中架空线路 33.3km，电缆线路 0.08km。			
			杆塔情况	本工程采用《国家电网有限公司 35~750kV 输变电工程通用设计通用设备应用目录》(2023 版) 中的 110-EB21D、110-EB21S、110-EC21D 模块。塔型为自立式角钢塔，杆塔共计 98 基。			
基础型式	直柱板式基础、掏挖基础、挖孔基础、灌注桩基础。						
二、项目组成及主要技术指标							
项目组成		占地面积 (hm ²)			主要技术指标		
		永久	临时	合计	数量	长度	宽度
丰南变电站扩建工程	站区	0.06		0.06			
	小计	0.06		0.06			
八德变电站扩建工程	站区	0.01		0.01			
	小计	0.01		0.01			
线路工程	塔基区	0.96		0.96	98 基		
	塔基施工场地区		2.17	2.17	98 处		
	牵张场区		0.28	0.28	7 处		
	施工道路区		1.32	1.32		2.4/6.0km	3.0/1.0m
	小计	0.96	3.77	4.73			
合计		1.03	3.77	4.80			

三、项目土石方量(万 m ³)						
项目		挖方	填方	调入	调出	备注
丰南变电站扩建工程	站区	0.11	0.04		0.07	调至塔基区整平处理。
	小计	0.11	0.04		0.07	
八德变电站扩建工程	站区	0.003	0.001		0.002	调至塔基区整平处理。
	小计	0.003	0.001		0.002	
线路工程	塔基区	1.02	1.092	0.072		
	塔基施工场地区	0.10	0.10			
	施工道路区	0.18	0.18			
	小计	1.30	1.372	0.072		
合计		1.413	1.413	0.072	0.072	

说明：丰南 110kV 变电站扩建工程（简称丰南变电站扩建工程，下同），八德 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程（简称八德变电站扩建工程，下同），八德—丰南 110kV 线路工程（简称线路工程，下同）。

2.1.1. 丰南变电站扩建工程

丰南 110kV 变电站站址位于四川省南充市仪陇县日兴镇白塔村四组，于 2020 年 4 月建成投运。

2.1.1.1. 建设规模

(1) 主变终期规模 3×50MVA，现有规模 2×50MVA（1、2 号），本期扩建 1×50MVA（3 号）。

(2) 110kV 终期出线 4 回；现有出线 3 回，至恩阳站 1 回、仪陇站 1 回、高坡站 1 回；本期扩建出线 1 回，至八德站。

(3) 35kV 终期出线 9 回，现有出线 4 回，本期扩建出线 1 回。

(4) 10kV 终期出线 24 回，现有出线 16 回，本期扩建出线 1 回。

(5) 低压无功补偿设备终期 2×(4008+6012)Kvar+2×5004Kvar 现有 2×(4.008+6.012)Kvar，本期扩建新增 3 号主变低压侧 2×5004Kvar。

(6) 10kV 接地变及消弧线圈成套装置终期 3×630kVA，现有 2×630kVA，本期无。

(7) 110kV 陇丰线和高丰线进行间隔调换，并更改为电缆出线。

2.1.1.2. 总平面布置

站区总平面布置近似呈矩形，进站道路自变电站西侧的潘家桥路乡村（水泥路）公路引接。110kV 配电装置布置于站区东侧，向东方向进线；生产配电综合楼布置于站区西侧，10kV 及 35kV 电缆出线至围墙外后分别朝北及南架空出线。主变压器布置于生产配电综合楼和 110kV 配电装置之间；电容器布置于站区南侧；

站区内公路主要为绕生产配电综合楼、主变与 110kV 配电装置之间布置。

本期扩建工程在拟扩建的 3 号主变区域内新建主变基础、主变构架、构架梁及主变防火墙部分均已建成；本期扩建的主变基础、设备支架、母线桥支架及基础，110kV 侧丰南~八德 110kV 出线间隔设备支架及基础、110kV 侧主变设备支架及基础、35kV 侧主变设备支架及基础部、10kV 电容器组位于预留场地内，本期扩建不需新增用地。为了全站的整体协调美观及运行维护方便，本次 3 号主变扩建总体平面布置与原已建的 1、2 号主变总体平面布置一致。

2.1.1.3. 竖向布置

扩建部分站区竖向设计考虑与原站设计相协调，本次扩建区域内场地设计标高与原站设计场地标高一致，排水坡向、坡度与原站设计一致。

本期进行主变压器、避雷器支架、隔离开关支架、电压互感器支架等基础开挖，挖方量 0.11 万 m³，回填量 0.04 万 m³，剩余 0.07 万 m³ 全部运至本项目输电线路塔基范围内整平。本期工程占地 0.06hm²，在原有围墙内的预留场地进行，不需新征用地。

2.1.1.4. 其他

本期工程已建设有完善道路、供排水设施等，可以满足本期建设需要，本期不再新增。

丰南变电站扩建工程主要技术经济指标见表 2.1-2。

表 2.1-2 丰南变电站扩建工程主要技术经济指标

序号	名称	单位	数量	备注
1	站址用地面积	hm ²	0.06	围墙内场地。
1.1	站区	hm ²	0.06	
2	土石方	挖方	万 m ³	0.11
		填方	万 m ³	0.04
		调出方	万 m ³	0.07

2.1.2. 八德变电站扩建工程

八德 220kV 变电站站址位于四川省南充市阆中市宝马镇一村八社，于 2021 年 12 月建成投运。

2.1.2.1. 本期建设规模

- (1) 主变压器：已上 2×180MVA，最终 3×180MVA，本期维持不变；
- (2) 220kV 出线：已上 2 回出线，最终 6 回，本期维持不变；

(3) 110kV 出线：已上 2 回出线，最终 10 回，本期扩建 1 回；

(4) 10kV 出线：已上 16 回出线，最终 24 回，本期维持不变。

2.1.2.2. 总平面布置

220kV、110kV 配电装置及主变场地采用平行布置，主变压器、配电综合楼布置在 220kV、110kV 配电装置之间。220kV 采用 GIS 配电装置布置于变电站西南侧，最终出线 6 回，均采用架空出线，向西南出线；110kV 采用 GIS 配电装置，布置于变电站东北侧，最终出线 10 回，采用架空出线，向东北出线；10kV 采用电缆出线方式。电容器组补偿装置布置于西北侧。变电站进站大门设于站区东南侧，进站道路从变电站东侧紧邻的乡村道路上引接。本期扩建工程维持原站总平面方案不变。

本期工程在现有围墙内扩建，本期扩建 1 个 110kV 出线间隔至丰南，位于 110kV 场地东北角，总平面布置及竖向布置形式均同前期。

2.1.2.3. 竖向布置

扩建部分站区竖向设计考虑与原站设计相协调，本次扩建区域内场地设计标高与原站设计场地标高一致，排水坡向、坡度与原站设计一致。

本期进行避雷器支架等基础开挖，挖方量 0.003 万 m³，回填量 0.001 万 m³，剩余 0.002 万 m³ 全部运至本项目输电线路塔基范围内整平。本期工程占地 0.01hm²，在原有围墙内的预留场地进行，不需新征用地。

2.1.2.4. 其他

本期工程已建设有完善道路、供排水设施等，可以满足本期建设需要，本期不再新增。

八德变电站扩建工程主要技术经济指标见表 2.1-3。

表 2.1-3 八德变电站扩建工程主要技术经济指标

序号	名称	单位	数量	备注	
1	站址用地面积	hm ²	0.01	围墙内场地。	
1.1	站区	hm ²	0.01		
2	土石方	挖方	万 m ³	0.003	
		填方	万 m ³	0.001	
		调出方	万 m ³	0.002	调至塔基区整平处理。

2.1.3. 线路工程

(1) 路径选择原则

路径选择本着统筹兼顾，相互协调，充分考虑水土保持因素，通过对生态敏感区的合理避让，充分利用现有设施等以降低水土流失的影响，具体如下：

1) 根据电力系统规划要求，综合考虑施工、运行、交通条件和线路长度等因素，进行方案比较，使线路路径走向安全可靠，经济合理；

2) 避开泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站；

3) 充分征求沿线政府、军事等单位的意见，综合协调本线路路径与城市、乡镇、部队等规划设施的关系，统筹考虑线路路径方案；

4) 尽量避免从采矿区、采石场等区域通过，尽量避免和缩短重污秽区段，降低建设投资，为线路安全、可靠运行创造条件；

5) 尽可能避开林区或沿林区边缘通过，以减少林木砍伐量，保护自然环境。对部分跨越林区线路，考虑采用增加塔高的办法跨越，仅对塔位施工范围内的林木砍伐，减少破坏植被的面积，杆塔定位尽可能避开果园，经济作物田地；

6) 尽量避让水土流失重点预防区和重点治理区，水土流失严重、生态脆弱地区，重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区（可能影响水质的）、以及水功能二级区的饮用水源区；

7) 尽可能靠近现有国道、省道、县道及乡村公路，尽可能缩短新修机械运输道路和人抬便道的长度，减少扰动地表、损坏水土保持设施的面积；

8) 尽量利用分界地区，城镇、乡镇之间结合部，利用率较低的土地，通过本工程建设可加强该区域水土保持工作；

9) 减少交叉跨越输电线路工程、公路及铁路等，尽可能减少跨越施工场地数量，以减少地表扰动；

10) 在路径选择体现以人为本、保护环境意识，尽量避免大面积拆迁民房。

(2) 线路走向

线路起于八德 220kV 变电站，止于丰南 110kV 变电站。新建线路 33.38km，其中架空线路 33.3km，电缆线路 0.08km。线路位于四川省南充市仪陇县、阆中市，为山丘区，自然海拔高度在 360~630m 之间。

1) 线路工程（架空段）

新建 110kV 线路起于 220kV 八德变 110kV 构架,新建同塔双回单回挂线 0.6km 至罗公寨村改为单回架设再经明清村、何家沟、邓家包、何家湾、王家湾,任家坪、玉皇寨、在陈家湾钻越在建±800kV 哈重线后跨过 G244 国道经花园沟、石榴村后跨越 35kV 丰兴线（与 35kV 丰金线马鞍支线同塔双回架设）后,再改为同塔双回双侧挂线至 110kV 丰南站变。新建线路路径长约 33.3km（其中八德站侧新建同塔双回单侧挂线线路路径长约 0.6km,新建单回架空线路长度约 32.7km、丰南站侧 0.1km 采用同塔双回双侧挂线）。

2) 线路工程（电缆段）

为避免八德—丰南 110kV 线路与仪陇—丰南线在同一段母线上,需将高坡—丰南线、仪陇—丰南线间隔进行互换。

本期高坡-丰南、仪陇-丰南间隔互换,需在原 110kV 高丰线 65#终端塔至丰南变线下组立 1 基终端塔后,然后采用架空+电缆方式将高坡-丰南、仪陇-丰南间隔进行互换。其中高丰线改建点起于原线 65 号终端塔大号侧新建双回终端塔（一侧自带电缆平台）,改为电缆敷设进丰南变原 110kV 陇丰线间隔;陇丰线改建点起于原线路 95 号终端塔（新建独立电缆平台 1 座）,改为电缆敷设进丰南变原 110kV 高丰线间隔。新建电缆段长 0.08km（其中陇丰线 95 号终端塔至原高丰线丰南站侧间隔路径长度 0.04km,高丰线改建点至原陇丰线丰南站侧间隔路径长度 0.04km）。

（3）杆塔型式情况

本工程采用《国家电网有限公司 35~750kV 输变电工程通用设计通用设备应用目录》（2023 版）中的 110-EB21D、110-EB21S、110-EC21D 模块。塔型为自立式角钢塔,杆塔共计 98 基。

表 2.1-4 铁塔型式及数量情况

塔型	数量 (基)	根开 (mm)	单基永久占地 (m ²)	单基临时占地 (m ²)
110-EB21D-ZMC2	21	5314	53	182
110-EB21D-ZMC3	15	6531	73	200
110-EB21D-ZMC3G	4	9650	136	250
110-EB21D-ZMC4G	1	10330	152	261
110-EB21D-ZMCK	12	8125	103	226
110-EB21D-ZMCKG	2	10320	152	261
110-EA21S-ZMC3	1	7228	85	212
110-EB21S-DJC	3	10080	146	257
110-EC21D-JC1	18	8390	108	230
110-EC21D-JC1G	1	9210	126	243
110-EC21D-JC2	11	8720	115	235
110-EC21D-JC2G	2	11350	178	278
110-EC21D-JC3	5	9250	127	244
110-EC21D-JC3G	1	9910	142	254
110-EC21D-DJCG	1	10640	160	266

(4) 杆塔基础

杆塔基础有直柱板式基础、掏挖基础、挖孔基础、灌注桩基础。

1) 直柱板式基础

现浇钢筋混凝土直柱基础施工方便，基础作用力较小时，相同条件下，与斜柱基础材料耗量差别不大。根据所选铁塔类型，在荷载较小的小转角线塔基础采用直柱基础型式。

2) 掏挖基础

该型基础主要用于塔位地形起伏较大、基坑开挖不受地下水影响、铁塔基础作用力较大的铁塔。该型能尽量减少土方量，减少对周围环境、土质的影响。对于基础作用力较大的铁塔较掏挖基础更为经济。

3) 挖孔基础

该基础在地形复杂、场地狭窄、高差较大，基础外露较高、基础荷载较大的塔位使用时具有明显的优势。该基础施工开挖量较少，施工对环境的破坏小，能有效保护塔基周围的自然地貌。由于埋深较深，它不但能满足基础的保护范围要求，也能有效地保持边坡的稳定。该基础在常规开挖方式情况下根据实际的地形及地质情况选用，在机械化施工方式下大量采用。

4) 灌注桩基础

在回填土较厚的区域、交通条件便捷、地质条件较差的河漫滩、洪水易冲刷地区的塔位采用灌注桩基础。相对其他基础而言，灌注桩基础具有施工方便、施工安全等特点。

表 2.1-5 线路工程主要经济技术表

线路名称	南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程
地理位置	四川省南充市仪陇县、阆中市
起迄点	线路起于八德 220kV 变电站，止于丰南 110kV 变电站。
电压等级	110kV
线路长度	新建线路 33.38km，其中架空线路 33.3km，电缆线路 0.08km。
杆塔总数	杆塔共计 98 基
沿线海拔高度	360~630m
地震烈度	VI度
沿线地形	山地 40%、丘陵 60%
铁塔型式	自立式铁塔
基础型式	直柱板式基础、掏挖基础、挖孔基础、灌注桩基础
接地型式	环形框放射线

2.2. 施工组织

2.2.1. 施工用水用电

(1) 丰南变电站扩建工程

前期工程已建，本期施工用水、用电等均可利用站内设施，无需新增。

(2) 八德变电站扩建工程

前期工程已建，本期施工用水、用电等均可利用站内设施，无需新增。

(3) 线路工程

线路工程基础施工用水量较少，使用汽车或人力工具运输。施工过程中用电根据周边设施情况安排，周围已有用电用户区，可按照安全用电规定引接用于施工用电，无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源。

2.2.2. 建筑材料

施工所需砂、石等建筑材料就近向合法的砂石料场购买，其水土保持责任在供应合同中明确由卖方负责。水泥、钢材等建筑材料就近向具有营业执照的正规销售处购买，其水土保持责任在供应合同中明确由卖方负责。

本工程建设过程当中设置了一些材料临时保管处，即材料站。主要用来堆放

施工建设的杆塔组装材料以及导线和接地线等其它材料。杆塔组装材料、导线、接地线等各种建筑材料从当地运输过来时将进行集中堆放保管，以避免材料的遗失。材料站采用租赁民房或当地空闲仓库的方式解决，本项目不再统计占地。

2.2.3. 施工场地

(1) 丰南变电站扩建工程

施工生产区可充分利用站内扩建预留场地布置，不在站外新增用地；施工生活区租用附近民房。

(2) 八德变电站扩建工程

施工生产区可充分利用站内扩建预留场地布置，不在站外新增用地；施工生活区租用附近民房。

(3) 线路工程

1) 塔基施工场地

塔基施工过程中需在塔基周边布设施工场地，用于临时堆放土方（含表土）、砂石料、水、材料和工具等。线路大部分区域都可采购商品混凝土，个别塔位需现场搅拌，可在施工场地或牵张场内设小型混凝土搅拌站，不需另外租用场地。采用灌注桩基础，则需另行设置泥浆沉淀池用地，用于沉淀塔基施工泥浆和钻渣。

根据同类工程经验及工程实际情况，塔基施工临时场地以单个塔基为单位零星布置，塔基施工场地设置原则为在每一个塔基周边设置一个施工场地。单个塔基施工场地占地范围为 182~278m²，共布设 98 处。

2) 牵张场

为满足施工放线需要，沿线需设置牵张场地，牵张场应满足牵引机、张力机能直接运达到位，地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。为满足牵引机、张力机工作。牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线区、压接区、工具集放区、工棚布置区、休息区、油料区和标志牌布置区。为方便机械设备和导线的运输与吊装，在牵张场地内规划出施工通道，通道宽度在 3.0m 左右，一般满足一辆大卡车通行便可，通道做适当平整后铺设 6mm 厚钢板，钢板铺设做到横平竖直，钢板搭头无上翘。

牵张场选择地形平缓的场地进行施工，尽量避免占用林地及耕地，施工过程中牵张场采取彩条布铺垫的方式，根据同类工程经验及实际情况，牵张场每隔

4km~6km 设置一处牵张场地，牵张场占地按 400m²/个考虑，共布设 7 处。

3) 跨越施工场地

线路跨越道路、电力线路等，采用封网跨越技术，不考虑布设跨越施工场地。

4) 施工生活用地

由于线路塔基及牵张场较分散，施工周期短，沿线村庄较多，因此工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。

2.2.4. 施工道路

本工程在利用已有公路、乡村道路等基础上，仍需要布设部分机械运输道路和人抬道路。

(1) 机械运输道路

机械运输道路主要为外部运输道路与牵张场、塔基连接的道路，牵张场及塔基所在区域原则上选择在交通较为方便的山间平地、丘间平地或较平缓坡地，方便塔材、设备和导线的运输，但由于受线路沿线地形限制，并不是每处牵张场、塔基均能选择在交通较为方便的区域，因此，就需要新修一部分运输道路通向牵张场、塔基，以方便机械运输塔材、设备、导线及其它施工材料。本着“少破坏、少扰动地表”原则，塔材、设备等运输尽量利用已有道路，仅在无现有道路可利用且人力运输困难局部地段新修机械运输道路，起到连接人抬道路和现有道路作用。

根据同类工程经验及实际情况，本工程需新修机械运输道路 2400m，新修机械运输道路占地宽 3m，为土质路面，占地为 0.72hm²。

(2) 人抬道路

线路工程建设当中，建筑材料、杆塔材料等需要往施工场地运输，外部运输到距离施工场地最近处后由人抬或者马驮的方式进行材料的运输。

根据同类工程经验及实际情况，本工程需新修人抬道长 6000m，占地宽 1m，为土质路面，占地为 0.60hm²。

2.2.5. 施工工艺

(1) 变电站工程

扩建土建施工主要为主变压器、电缆沟等基础开挖。开挖时采用机械结合人工的方式，开挖后的基坑土运至站内临时堆土场，采取临时防护措施，土方全部综合利用。扩建区主要涉及采用人工开挖电气设备基槽，钢模板浇制基础，钢管

人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，以及设备支架为浇制基础，预制构件在现场组立。电缆沟施工主要采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽，管道敷设顺序为：测量定线-清除障碍物-平整工作带-管沟开挖-钢管运输、布管-组装焊接-下沟-回填-竣工验收。

(2) 线路工程

线路工程施工主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。对水土流失影响较大的是施工准备及基础施工两个阶段。

1) 施工准备

施工准备阶段涉及水土保持的有准备建筑材料，设置生产场地、生活用房等。

2) 基础施工

基础施工流程大体如下：

塔腿小平台开挖：包括排水沟开挖；位于斜坡的塔基表面应回填成斜面，恢复自然排水，对可能出现较大汇水面且土层较厚的塔位，要求开挖排水沟，并接入原地形自然排水系统。

开挖塔腿基础坑。凡能开挖成形的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，尽可能减少开挖量。

开挖接地槽，对位于附近人口稀少的塔位，接地沟开挖可不形成封闭环形（允许开断一点），以避免沿垂直方向开挖接地沟从而形成冲沟危及塔位边坡的安全。

绑扎钢筋、浇注塔腿基础混凝土，埋接地线材。

基坑回填，余土处置。基坑回填时采取“先粗后细”方式，方便地表迹地恢复。降基面及基坑开挖的余土置于塔位范围内放坡处理。

3) 组塔

当塔基础混凝土强度达到设计值的 70% 以上后，便可在塔位上组装铁塔组件成塔。本阶段在塔基区仅存在从加工厂运来的铁塔组件的堆放、组装，在搬运过程对地面略有扰动，造成的水土流失轻微。

4) 放紧线和附件安装

架线施工的主要流程：施工准备（包括通道清理）——放线——紧线——附件及金具安装。

架线主要采取张力放线的方式，首先将导线穿过铁塔挂线处，然后用牵张机进行张力牵放方法牵张。

牵张场使用时间多在 10~15 天，习惯上场地选择都注意场地平整工作量小、费用低的地方，相应对水土流失的影响也较小。本工程铁塔采用架线高跨，可减少树木的砍伐。

2.3. 工程占地

本工程建设占地包括工程永久占地和施工临时占地，永久占地包括站区、塔基区，临时占地包括塔基施工场地、牵张场、施工道路。

按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）的分类方法，针对水土保持及本工程特点，将项目建设区占地类型分为耕地、园地、林地、公共管理与公共服务用地。

本工程总占地 4.80hm²，其中仪陇县为 2.05hm²、阆中市为 2.75hm²。

按占地性质划分，其中永久占地 1.03hm²、临时占地 3.77hm²。

按占地类型划分，其中耕地 1.18hm²、园地 0.71hm²、林地 2.84hm²、公共管理与公共服务用地 0.07hm²。

本工程占地情况详见表 2.3-1、2.3-2。

表 2.3-1 本工程按项目划分占地面积情况 单位：hm²

项目		占地类型				占地性质		合计
		耕地	园地	林地	公共管理与公共服务用地	永久占地	临时占地	
丰南变电站扩建工程	站区				0.06	0.06		0.06
	小计				0.06	0.06		0.06
八德变电站扩建工程	站区				0.01	0.01		0.01
	小计				0.01	0.01		0.01
线路工程	塔基区	0.24	0.14	0.58		0.96		0.96
	塔基施工场地	0.54	0.33	1.30			2.17	2.17
	牵张场区	0.07	0.04	0.17			0.28	0.28
	施工道路区	0.33	0.20	0.79			1.32	1.32
	小计	1.18	0.71	2.84		0.96	3.77	4.73
合计		1.18	0.71	2.84	0.07	1.03	3.77	4.80

表 2.3-2 本工程按行政区划分占地面积情况 单位: hm^2

项目		占地类型				占地性质		合计
		耕地	园地	林地	公共管理与公共服务用地	永久占地	临时占地	
1	仪陇县	0.50	0.30	1.19	0.06	0.47	1.58	2.05
丰南变电站扩建工程	站区				0.06	0.06		0.06
	小计				0.06	0.06		0.06
线路工程	塔基区	0.10	0.06	0.25		0.41		0.41
	塔基施工场地区	0.23	0.14	0.55			0.92	0.92
	牵张场区	0.03	0.02	0.07			0.12	0.12
	施工道路区	0.14	0.08	0.32			0.54	0.54
	小计	0.50	0.30	1.19		0.41	1.58	1.99
2	阆中市	0.68	0.41	1.65	0.01	0.56	2.19	2.75
八德变电站扩建工程	站区				0.01	0.01		0.01
	小计				0.01	0.01		0.01
线路工程	塔基区	0.14	0.08	0.33		0.55		0.55
	塔基施工场地区	0.31	0.19	0.75			1.25	1.25
	牵张场区	0.04	0.02	0.10			0.16	0.16
	施工道路区	0.19	0.12	0.47			0.78	0.78
	小计	0.68	0.41	1.65		0.55	2.19	2.74
合计		1.18	0.71	2.84	0.07	1.03	3.77	4.80

2.4. 土石方平衡

本工程挖填方 2.826 万 m^3 ，其中挖方 1.413 万 m^3 （表土剥离 0.15 万 m^3 ），填方 1.413 万 m^3 （表土回覆 0.15 万 m^3 ），无外弃方和借方。

2.4.1. 表土剥离及回覆

对扰动地表区域表土资源进行收集并保存，是保障工程施工结束后扰动地表植被恢复及土地利用的关键因素。项目区部分占用林地、园地区域虽然有表土，但表层土较薄，不具备剥离条件。

(1) 丰南变电站扩建工程

变电站扩建场地现状为硬化等场地，无表土，不需要表土剥离。

(2) 八德变电站扩建工程

变电站扩建场地现状为硬化等场地，无表土，不需要表土剥离。

(3) 线路工程

1) 塔基区

基坑开挖土石方开挖，对扰动深度大于 20cm 的耕地、园地、林地进行表土剥

离，表土剥离厚度 0.10m~0.30m，剥离表土临时堆存于施工场地内。剥离表土面积 0.58hm²，剥离厚度 0.10m~0.30m，剥离量 0.12 万 m³。覆土面积 0.58hm²，覆土厚度 0.10m~0.30m，覆土量 0.12 万 m³。

2) 塔基施工场区

地主要用于堆放临时堆土和设备材料，为利于堆土及材料堆放，部分坡地塔基施工场地需要进行局部简单平整，扰动地表很小，施工过程考虑铺设彩条布，可不进行表土剥离。

3) 施工道路区

机械运输道路修筑有土石方开挖，对扰动深度大于 20cm 的耕地、园地、林地进行表土剥离，表土剥离厚度 0.10m~0.30m，剥离表土临时堆存于道路一侧。剥离表土面积 0.18hm²，剥离厚度 0.10m~0.30m，剥离量 0.03 万 m³。覆土面积 0.18hm²，覆土厚度 0.10m~0.30m，覆土量 0.03 万 m³。

人抬道路需要进行局部简单平整，扰动地表很小，可不进行表土剥离。

4) 牵张场

牵张场铺设彩条布，可降低施工活动对原地貌的扰动，可不进行表土剥离。

本工程表土剥离及回覆见表 2.4-1、图 2.4-1。

表 2.4-1 本工程表土平衡表 单位：万 m³

项目	表土剥离	表土回覆	调入方		调出方	
			总量	来源	总量	去向
线路工程	塔基区	0.12	0.12			
	施工道路区	0.03	0.03			
	小计	0.15	0.15			

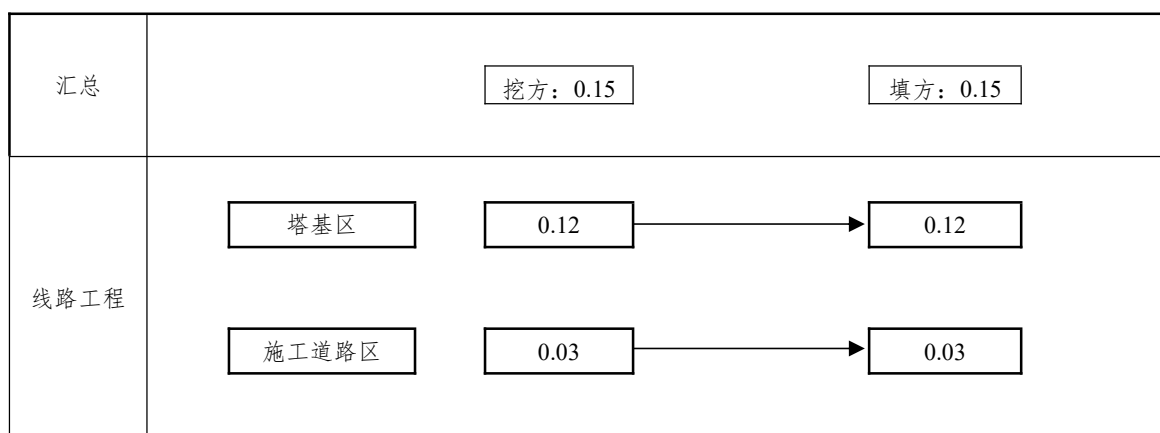


图 2.4-1 本工程表土平衡流向框图 单位：万 m³

2.4.2. 土石方开挖与回填

(1) 丰南变电站扩建工程

1) 站区

本期进行主变压器、避雷器支架、隔离开关支架、电压互感器支架等基础开挖，挖方量 0.11 万 m³，回填量 0.04 万 m³，剩余 0.07 万 m³ 全部运至本项目输电线路塔基范围内整平。

(2) 八德变电站扩建工程

1) 站区

本期进行避雷器支架等基础开挖，挖方量 0.003 万 m³，回填量 0.001 万 m³，剩余 0.002 万 m³ 全部运至本项目输电线路塔基范围内整平。

(3) 线路工程

1) 塔基区

塔基区土石方来源于塔基基座、接地沟槽等开挖，塔基区挖方量 0.90 万 m³，填方量 0.90 万 m³（含塔基范围内整平处理 0.13 万 m³）。

2) 塔基施工场地区

塔基施工场地区主要为塔基施工材料堆放和混凝土搅拌场地，个别场地需要简单平整，大部分场地只是材料对地表的占压，施工时间很短，扰动地表很小。塔基施工场地区挖方量 0.10 万 m³，填方量 0.10 万 m³。

3) 施工道路区

施工道路区依据地形条件，尽量选择平缓区域，为施工便利，进行少量的场地平整，随挖随填。施工道路区挖方量 0.15 万 m³，填方量 0.15 万 m³。

本工程土石方平衡情况详见表 2.4-2、图 2.4-2。

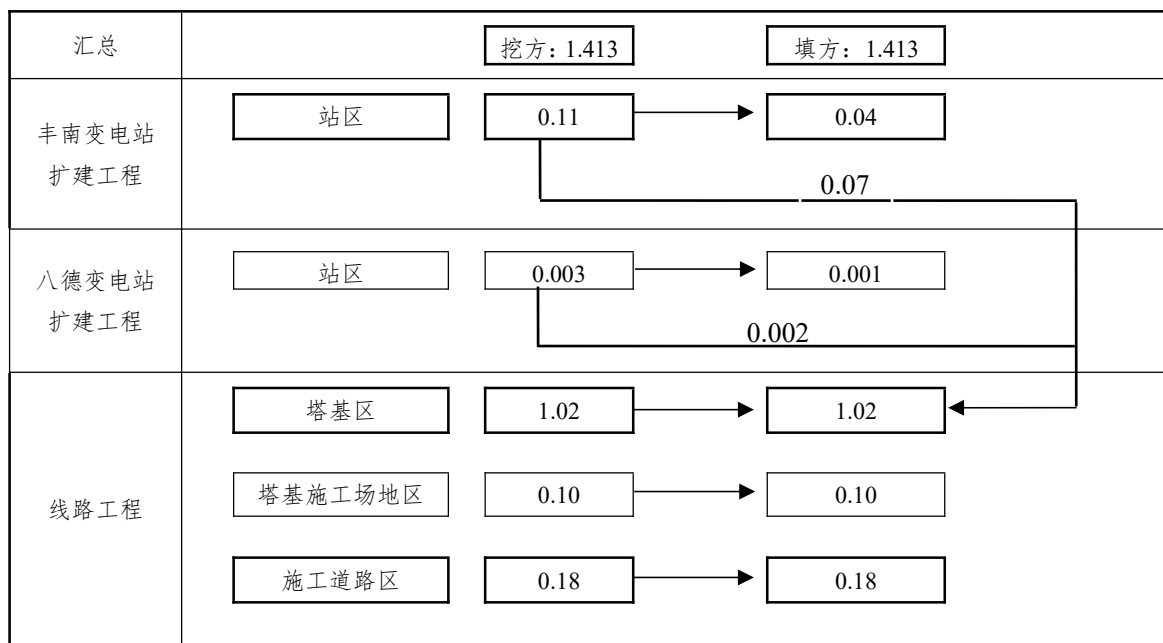


图 2.4-2 本工程土石方平衡流向框图 (含表土) 单位: 万 m³

2.5. 拆迁 (移民) 安置与专项设施改 (迁) 建

本工程不涉拆迁 (移民) 安置与专项设施改 (迁) 建。

2.6. 施工进度

根据类似工程施工经验, 本工程计划于 2024 年 10 月开工, 2025 年 12 月竣工, 总工期 15 个月, 施工进度安排见表 2.6-1。

表 2.6-1 施工进度一览表 单位: 月

项目	时间	2024 年			2025 年											
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
变电站工程	施工准备	■	■	■												
	土建工程				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	设备安装调试										■	■	■	■	■	■
线路工程	施工准备	■	■	■												
	土建工程				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	杆塔组立									■	■	■	■	■	■	■
	架线及附件											■	■	■	■	■

2.7. 自然概况

(1) 地形地貌

项目区地貌为山地 (40%) 和丘陵 (60%), 海拔高程在 360~630m 之间。



(2) 地质

在区域大地构造位置上，工程场地位于扬子准地台四川台坳之川中台拱核心部位，其东北方向为川北台陷，西北方向为川西台陷，东南方向为川东陷褶束。

以岷山断块和龙门山构造带为界，以西的地区，断裂规模大、活动性强，地震频发，尤其是6级以上强震主要集中于块体边界断裂上，是活动构造区；以东的四川盆地断裂构造不甚发育，规模小，活动性弱，仅有一些零星的中强地震活动记载，是相对的稳定区。工程场地正处于相对稳定的四川盆地内。工程区位于四川沉降带川中褶皱旋扭构造体系之龙女寺半环状构造西北缘。北面昆邻中台山半环状构造，西面紧靠天仙寺涡轮状构造。构造形迹主要表现为一系列宽缓背斜、向斜组成的区域东西向构造带，断裂构造不发育，岩层产状平缓。

项目区内第四系覆盖层零星分布，主要为分布于斜坡及坡脚的坡残积粘土夹块碎石，分布于丘间冲沟的为冲洪积粘土或壤土。

第四系上更新统冲积堆积层(Q3al)：黄褐色泥砾层，砂砾层，黄褐色粘土、亚粘土，分布于金台场和搬罾间的广大区域。

第四系全新统坡积、残积堆积层(Q4dl+el)：黄褐色或紫褐色粘土、壤土，偶夹砂岩或泥岩碎块，呈硬塑~塑状，厚1~6.5m，分布于冲沟两侧及斜坡平台上。

第四系全新统坡积、洪积堆积层(Q4dl+pl)：褐黄色、灰色粘土，含少量砂岩或泥岩块碎石，塑状~软塑状，厚4~8m，分布于冲沟及洼地。

第四系全新统冲积、洪积堆积层(Q4al+pl)：棕红、灰色、灰黑色粘土、壤土，夹少量砂壤土、粉细砂与淤泥质粘土。粘土、壤土可塑~软塑状，强度低，中等压缩，渗透性微弱，厚3~11m，分布于洼地或沟谷底部。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(局部修订2016年版)及《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)相关规定，抗震设防烈度为VI度，设计基本地震加速度值为0.05g，反应谱特征周期为0.35s。

线路沿线按岩性及地下水的赋存形式，主要为基岩裂隙水和松散岩类第四纪孔隙水两大类型。基岩出露地段多为基岩裂隙水，经过区多为斜坡状。受大气降水补给，向沟谷迅速排泄，由于地形陡峻，切割强烈，径流条件好。地下水埋深>5m，对塔基无影响。第四纪孔隙水主要分布在第四系堆积物中，其中水介质由粘性土及碎石土组成。残丘平原堆积物的成分、结构、厚度变化及其分布规律决定了堆积物的透水性和含水性强弱不均，季节性变化较大。主要受大气降水补给，向沟谷排泄，无固定水位，可不考虑地下水对塔基的影响。

项目区无崩塌、滑坡、泥石流、采空区等不良地质作用。

(3) 气象

项目区属于亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，冬暖夏热，春早、夏长、秋短，无霜期长，雨量充沛，多集中在夏季。多秋雨，多云雾，湿度大，日照少，风力小。一年分为干季和湿季两季，干季从11月至翌年4月，湿季从5月至10月。多年平均气温16.9~17.6℃，≥10℃积温5421~5444.6，多年平均降水量1043~1081.6mm，多年平均蒸发量1026.5~1275mm，无霜日数301~303d，多年平均风速1.2~1.6m/s，多年平均相对湿度78~82%。

表 2.7.1 气象站气象要素特征值表

行政区	仪陇县	阆中市
多年平均气温 (°C)	17.6	16.9
极端最高气温 (°C)	41.3	38.6
极端最低气温 (°C)	-3.7	-4.1
≥10℃积温 (°C)	5421	5444.6
多年平均蒸发量 (mm)	1026.5	1275
多年平均降水量 (mm)	1081.6	1043
无霜期 (d)	303	301
多年平均风速 (m/s)	1.2	1.6
主导风向	S	NNW
多年平均相对湿度 (%)	82	78

(4) 水文

本工程属长江水利委员会管理。

仪陇县境内主要有四条河流(仪陇河、新寺河、消水河、嘉陵江)纵贯全境，属于渠江水系、嘉陵江水系，其面积占幅员面积的90%。渠江水系的河流有仪陇河、新寺河、消水河，其中仪陇河发源于仪陇与巴中交界的檬垭，在仪陇县境又称绿水河、二道河，河源段又称中坝河。仪陇河东南流经日兴、绿水、新店、骆市、小桥等地，于黄渡与消水河汇合，流域面积597km²，境内面积543.9km²；新寺河流域面积335.6km²；消水河发源于巴中群乐乡大沙坪，在仪陇县境内又称梯子河，自北向南流，入仪陇县境后，至义路乡折向南流。穿思德水库，曲折南流。至行锋村，左纳玉桥河，至龙桥乡，左纳龙桥河，至三河乡右纳骑龙河、灯塔河，过板桥乡出仪陇入营山县境。过三元、消水、二龙，于黄渡与西来的仪陇河汇合，流域面积511.8km²，境内面积457.1km²。嘉陵江水系的河流只有泥槽河，该河贯穿于新政区三乡一镇，其流域面积246.6km²。

阆中市地表水系较为发达，属于嘉陵江流域，溪河众多，长度在10km以上的

河流约 100 条，流域面积在 100km² 以上河流约 20 条。嘉陵区内分布的河流主要有嘉陵江、曲水河、吉安河、桓子河等，可利用水资源总量 7220.8 万 m³，天然地下资源 2629.8 万 m³，嘉陵江从北向南、纵贯全境，流经阆中、南部、仪陇（新政）、蓬安 4 县（市）和 顺庆、高坪、嘉陵 3 区，境内干流长 271 公里，是流经市域的最大河流。

项目区只涉及小河沟及堰塘。

（5）土壤

仪陇县成土母质主要有四种：①侏罗系统蓬莱镇组母岩覆盖 1498.7km²，占幅员面积的 88.58%，属灰棕色土；②白垩系下统成城墙岩群覆盖 123.95km²，占幅员面积的 7.33%，形成黄红色土，主要分布在福临乡、日兴镇、三蛟镇、张公镇一带；③侏罗系中统遂宁组覆盖 47.52km²，占幅员面积的 2.81%，形成的棕色土壤；④冲积、沉积物覆盖面积 21.76 km²，占幅员面积的 1.28%，形成的灰棕色土，主要分布在嘉陵江沿岸的一、二、三级阶地和仪陇河、新寺河、消水河的漫滩一级阶地土。

阆中市基带土壤为紫色土带，区内土壤类型多样，主要有潮土、黄壤、紫色土、水稻土等土壤类型。土壤耕作熟化程度高，有机质及养分含量较高，土质疏松，排水良好，保水保肥较强，适宜多种农作物生长。

根据收集资料和现场调查情况，区域土壤以水稻土、紫色土和黄壤土为主，表层土厚度在 10~30cm 不等，抗蚀性和水土保持功能较差。本工程表土剥离面积为 0.76hm²，剥离范围为线路工程塔基区、施工道路。

（6）植被

仪陇县属亚热带常绿阔叶林带，气候温暖，雨量充沛，土地肥沃，植被种类丰富，形成亚热带常绿阔叶、落叶阔叶与针叶林为主的低山、丘陵天然林、人工次生林。仪陇县森林植被有 55 个科，112 种，主要树木有柏树、马尾松、桉木、青冈、油桐、乌桕、柑桔、枇杷、杏、李、桃、黄柏等，灌木有马桑、黄荆等。草类主要有芭茅、茅草、莎草等。竹类主要是慈竹。农作物栽培植被主要有水稻、小麦、红苕、玉米、胡豆、豌豆、油菜、花生、棉花、甘蔗、各种豆类及蔬菜和少量药材。

阆中市植被类型属亚热带常绿阔叶和针叶混交林区，木本植物种类繁多，有

用材树种、珍贵树种、经济树种、观赏树种、薪炭林树种等，竹类资源丰富。阆中市林木树种有柏、杉、榆、杨柳、桃金娘等 60 科，120 属，共 400 余种。主要树种有马尾松、柏树、香樟、斑竹等，灌木类型主要有黄荆、马桑等，经济林木以板栗、蓖麻、桑树等为主，草种类型有铁马鞭、五朵云等，农作物以水稻、玉米为主。

根据收集资料和现场调查情况，项目所在区域属亚热带常绿阔叶林区，主要为松树和杂树、山地灌丛，林草覆盖率为 30~40%。

(7) 水土保持敏感区

本项目在四川省南充市仪陇县、阆中市境内建设，仪陇县、阆中市属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等水土保持敏感区域。

3. 项目水土保持评价

3.1. 主体工程选址（线）水土保持评价

本方案对照《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等法律法规，关于工程选址（线）水土保持约束性进行逐条分析，对存在约束性又无法避让的提出了相应的要求，详见表 3.1-1~3.1-2。

表 3.1-1 与《中华人民共和国水土保持法》水土保持评价

序号	约束性条件	本工程情况	分析评价
1	第十七条：禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。	不涉及	符合要求
2	第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。	不涉及	符合要求
3	第二十条：禁止在 25 度以上陡坡地开垦种植农作物	不涉及	符合要求
4	第二十一条：禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等	本项目建设会占用一定的林地和耕地，但不涉及铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。	符合要求
5	第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防和重点治理区，无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。	本工程所经仪陇县、阆中市属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。本方案按西南紫色土区一级防治标准，施工过程中采取无人机放线、高低腿等先进的施工方法工艺，建设单位在建设过程中加强工程管理，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。	符合要求
6	第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应该编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土方案，采取水土流失预防和治理措施。	建设单位已委托我公司开展本工程的水土保持方案编制工作。	符合要求
7	第二十六条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。	项目尚未开工建设，建设单位已委托我公司开展本工程的水土保持方案编制工作。	符合要求

8	第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措​​施保证不产生新的危害。	本工程挖填方 2.826 万 m ³ ，其中挖方 1.413 万 m ³ （表土剥离 0.15 万 m ³ ），填方 1.413 万 m ³ （表土回覆 0.15 万 m ³ ），无外弃方和借方。	符合要求
9	第三十二条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理	工程建设将损坏水土保持设施，本方案将计列水土保持补偿费，由建设单位缴纳，专项用于水土流失预防和治理。	符合要求
综上所述，本工程符合《中华人民共和国水土保持法》的相关规定			

表 3.1-2 与《生产建设项目水土保持技术标准》水土保持评价

项目	规范所列约束性规定	本工程情况	分析评价
3.2.1	主体工程选址（线）应避让下列区域： （1）水土流失重点预防区和重点治理区； （2）河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带； （3）全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。	本工程无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，按西南紫色土区一级防治标准；工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周围的植物保护带；项目沿线占地范围内没有监测站、试验站和观测站	优化施工工艺，提高防治标准后，工程选址选线能满足约束性规定
3.2.2	建设方案应符合下列规定： （1）山丘区输电工程塔基采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式 （2）对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定： ①应优化方案，减少工程占地和土石方量。②截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级；③宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。④提高植物措施标准，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点	（1）主体塔基按要求采取“全方位、高低腿”型式，并要求在开挖前应设置拦挡设施；对跨越林区的路段，主体设计采取提高呼称高、加大塔基档距；（2）本工程无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区：①主体设计将根据现场实际情况，尽量利用已有道路，优化施工临时道路布设，尽量减少工程区占地；②本方案补充完善排水措施；③本方案将林草覆盖率提高 2 个百分点。	
3.3	西南紫色土区应符合下列规定：①应保存和综合利用土壤资源；②应避免破坏地下暗河和溶洞等地下水系。	①方案设计，在施工前对开挖区域进行表土剥离并进行防护，后期覆土利用；②不涉及。	符合规定
综上所述，本工程符合《生产建设项目水土保持技术标准》的相关规定			

综合分析，根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规定，本工程选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；线路路径已取得了沿线相关部门的路径协议；项目区属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治

理区且无法避让，提高水土流失防治标准等级，执行西南紫色土区一级标准，本方案根据工程实况进一步完善水土保持措施布设、优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，提高工程防护标准，加强防护、治理措施，提高林草覆盖率，能够达到水土保持相关要求。

3.2. 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1. 建设方案评价

(1) 丰南变电站扩建工程、八德变电站扩建工程在站区预留场地内扩建，进站道路、站外电源、站外供排水设施等可利用前期工程已有设施，减少了占地、土石方开挖和回填。

(2) 线路塔基位于山丘区，工程设计方案中塔基采用了不等高基础，线路采用掏挖基础、挖孔基础等基础，有效减少占地和土石方开挖和回填。

(3) 线路经过林区时采用高塔跨越方式通过，线路在通过林区和集中树林时，尽量减少树木的砍伐，保护植被。

(4) 线路方案考虑沿线交通条件、施工条件等，采用无人机等先进施工放线工艺，充分利用沿线现状道路，有效减少工程占地和土石方开挖和回填。

综合分析，本工程建设方案基本符合水土保持要求。

3.2.2. 工程占地评价

本工程主体设计在勘测设计过程中，严格遵守《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理实施条例》等有关法律法规要求，在保障满足项目建设的情况下，受地形地貌、地质条件等因素影响，仍占用部分耕地。

(1) 丰南变电站扩建工程

本期工程在站内预留场地扩建，变电站进站道路、供排水设施、电源等已非常完善，可以满足本期工程扩建需要，本期不再站外新增用地。丰南变电站扩建工程占地 0.06hm^2 ，为站内预留场地，既可满足建设需要，又不存在冗余占地，占地面积无需增减。

(2) 八德变电站扩建工程

本期工程在站内预留场地扩建，变电站进站道路、供排水设施、电源等已非常完善，可以满足本期工程扩建需要，本期不再站外新增用地。丰南变电站扩建

工程占地 0.01hm^2 ，为站内预留场地，既可满足建设需要，又不存在冗余占地，占地面积无需增减。

(3) 线路工程

线路工程路占地 4.73hm^2 ，线路工程临时占地依据输变电工程可行性研究阶段临时施工场地核算规定，从工程总体布置，施工方法、调查同类工程施工经验及实地测量等方面分析确定，在严格控制施工场地范围的前提下，充分考虑施工期间堆放材料、临时堆土、人员活动可能扰动的区域；线路工程各区占地即可满足施工需要，又不存在漏项和冗余占地，线路工程占地面积无需增减。

从水土保持角度分析，本工程主体设计占地面积合理，满足工程施工要求，不存在漏项，本方案无需增减。

3.2.3. 土石方平衡评价

本工程挖填方 2.826 万 m^3 ，其中挖方 1.413 万 m^3 （表土剥离 0.15 万 m^3 ），填方 1.413 万 m^3 （表土回覆 0.15 万 m^3 ），无外弃方和借方。

从水土保持角度分析，工程建设中尽可能利用开挖土石方，将开挖土石方作为回填料使用，降低工程投资和新增土壤流失量。综上所述，本工程土石方调配合理，项目区内土石方平衡。

3.2.4. 取土（石、砂）场设置评价

工程所需的砾石、沙子等建筑材料可从砂石厂直接购买，材料生产期间的水土流失防治责任由生产单位负责，运输期间的水土流失防治责任由运输单位负责；工程开工前，建设单位需同相关的生产企业、运输公司签订购买及运输合同，合同中需落实水土保持相关责任。

本工程不设置专用取土（石、砂）场，可降低取土过程中新增的水土流失量，符合水土保持要求，符合水土保持要求。

3.2.5. 弃土场设置评价

本工程未设置弃土场。

3.2.6. 施工方法与工艺评价

(1) 变电站工程

变电站基础工程等土建施工经历了雨季。雨水冲刷是本区域造成水土流失的

主要因素，站区布设较为完善的站区排水系统，能使站区雨水有序排放，有效降低工程建设造成的土壤流失量。但站区临时堆土可能产生因水土流失引发的堆土垮塌、沟道淤塞等问题，增加工程的施工难度。因此，本方案建议建设单位合理安排施工工期，将主要土建施工时段避开雨季，若不能避开雨季，则应避免在暴雨、大雨天气施工。在施工中应根据实际情况进一步加强采取相应的临时措施以最大限度的减少新增水土流失。

(2) 线路工程

线路工程施工工艺：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

1) 施工准备期剥离表土可保护土壤熟土耕作层不被破坏殆尽。

2) 基础开挖前设置挡护坡或开挖出小平台，除保障施工安全外还应减少水土流失；同时先修砌排水沟，防止施工期间地表径流对开挖面和临时堆土冲刷。

3) 对施工严格要求：凡能开挖成形的基坑，均采用以“坑壁”代替基础底模板方式开挖，尽可能减少开挖量。

4) 表土剥离工艺

本工程施工准备期剥离表土，有利于表土资源的再利用。在剥离表土前，需对开挖区域内的树桩、树根、杂草、垃圾、废渣等有碍物进行人工彻底清除；塔基区采用人工开挖的方式剥离表土，剥离后将表层土装袋，在施工期做挡护用，施工结束时用作绿化用土。表土回覆时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层。

3.2.7. 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

3.2.7.1. 线路工程

(1) 塔基区

1) 工程措施

——浆砌石排水沟

塔基排水沟主要布设在山坡侧汇水面的雨水及其它地表水对基面有冲刷影响的塔基处，沟底纵坡 2%，施工时根据实际地形情况作适当调整，以保证排水沟水流顺畅。排水沟断面尺寸上底宽×下底宽×高=0.5m×0.4m×0.5m，长为 100m，工程量为 11m³。排水沟能够疏导坡面来水，减少了地表水对塔基及周围地表的冲刷影

响，有利于边坡及基础稳定，排水设施具有良好的水土保持效果，属水土保持工程。

3.3. 主体工程设计中水土保持措施界定

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中水土保持工程界定原则，本工程排水沟措施界定为水土保持措施，详见表 3.3-1。

表 3.3-1 主体工程设计中水土保持措施

防治分区		工程措施	单位	工程量	规格	单价(元)	投资(万元)
线路工程	塔基区	浆砌石排水沟	m	100	上底宽×下底宽×高 =0.5m×0.4m×0.5m	/	/
			m ³	11		1100.00	1.21
合计							1.21

4. 水土流失分析与预测

4.1. 水土流失现状

根据《四川省水土保持规划（2015-2030年）》、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）等，仪陇县、阆中市一级区属于西南紫色土区（VI），二级区属于川渝山地丘陵区（VI-3），三级区属于四川盆地北中部山地丘陵保土人居环境维护区（VI-3-2tr）。全国水土保持区一级区西南紫色土区，水土流失以轻度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为 $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

根据全国水利普查数据结果和四川省水土流失动态监测成果，项目区水土流失类型主要以水力侵蚀为主，表现形式为面蚀、片蚀、沟蚀等，侵蚀强度以轻度侵蚀为主。仪陇县水土流失面积 859.01km^2 ，其中轻度流失面积为 203.46km^2 、中度流失面积为 345.81km^2 、强烈流失面积为 179.52km^2 、极强烈流失面积为 82.67km^2 ，剧烈流失面积为 47.55km^2 。阆中市水土流失面积 791.53km^2 ，其中轻度流失面积为 397.96km^2 、中度流失面积为 100.93km^2 、强烈流失面积为 95.34km^2 、极强烈流失面积为 120.98km^2 ，剧烈流失面积为 76.32km^2 。

本方案人员收集了项目区水土流失遥感调查结果、水土保持监测公报等，结合项目区原地貌占地类型、坡度、林草覆盖率、侵蚀强度等，最终确定工程土壤侵蚀模数背景值，工程区土壤侵蚀模数背景值约为 $1043\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

4.2. 水土流失影响因素分析

根据《生产建设项目水土保持技术标准（GB 50433-2018）》规定，水土流失影响因素分析应根据项目区自然条件、工程施工特点，分析工程建设与生产对水土流失的影响，明确建设和生产过程中扰动地表、损毁植被面积，废弃土石量。

4.2.1. 工程建设对水土流失的影响

本工程位于山丘区，占地类型为耕地、园地、林地、公共管理与公共服务用地，工程建设过程中占压地表、场地平整、基础开挖等将破坏原地表，使其失去原有防冲、固土的能力。

4.2.2. 扰动地表面积

本工程建设对原地貌、土地及植被的破坏情况分为永久占地和施工临时占地，

分别分区进行统计，统计的依据主要为工程设计文件、图纸及现场踏勘。经过统计分析，确定本工程扰动地表面积为 4.80hm^2 。

4.2.3. 损毁植被面积预测

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中相关规定，本工程损毁植被为林地、园地，损毁植被面积为 3.55hm^2 。

4.2.4. 弃渣量预测

本工程无弃方。

4.3. 土壤流失量预测

4.3.1. 项目区水土流失背景值

本方案人员收集了项目区水土流失遥感调查结果、水土保持监测公报等，结合项目区原地貌占地类型、坡度、林草覆盖率、侵蚀强度等，最终确定工程土壤侵蚀模数背景值，工程区土壤侵蚀模数背景值约为 $1043\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。

4.3.2. 项目区扰动后土壤侵蚀模数

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）的计算方法进行测算。本项目土壤流失类型主要为地表翻扰型一般扰动地表（简称“地表翻扰”）、植被破坏型一般扰动地表（简称“植被破坏”）等预测方法。

表 4.3-1 项目区扰动后土壤侵蚀模数情况

预测时段	预测区域		各个预测单元年参数						土壤侵蚀模数 (t/km ² .a)
			R	K	Ly	Sy	A	Myd	
施工期	丰南变电站扩建工程	站区	5523.2	0.0072	0.8121	0.3738	0.0100	0.26	2600
	八德变电站扩建工程	站区	5227.3	0.0071	0.8121	0.3738	0.0100	0.24	2400
	线路工程	塔基区	5367.4	0.0071	0.7017	2.3109	0.0098	0.95	9694
		塔基施工场地区	5367.4	0.0071	0.8628	1.4579	0.0223	1.67	7489
		牵张场区	5367.4	0.0071	0.9998	0.3738	0.0400	0.57	2882
		施工道路区	5367.4	0.0071	1.9018	0.7591	0.0100	0.86	8600
			R	K	Ly	Sy	A	Myd	
自然恢复期 (第 1 年)	线路工程	塔基区	5367.4	0.0071	0.7017	2.3109	0.0098	0.18	1837
		塔基施工场地区	5367.4	0.0071	0.8628	1.4579	0.0223	0.31	1390
		牵张场区	5367.4	0.0071	0.9998	0.3738	0.0400	0.17	827
		施工道路区	5367.4	0.0071	1.9018	0.7591	0.0100	0.16	1600
自然恢复期 (第 2 年)	线路工程	塔基区	5367.4	0.0071	0.7017	2.3109	0.0098	0.10	1020
		塔基施工场地区	5367.4	0.0071	0.8628	1.4579	0.0223	0.18	807
		牵张场区	5367.4	0.0071	0.9998	0.3738	0.0400	0.10	476
		施工道路区	5367.4	0.0071	1.9018	0.7591	0.0100	0.095	950

注：丰南变电站扩建工程和八德变电站扩建工程在自然恢复期扩建区域已全部硬化，无水土流失，故不再进行预测。线路工程 R、K 均按仪陇县、阆中市面积加强平均值计算值。

4.3.3. 预测单元及时段

本工程水土流失预测单元包含丰南变电站扩建工程站区，八德变电站扩建工程站区，线路工程塔基区、塔基施工场地区、牵张区、施工道路区等单元。

施工期（含施工准备期）施工期按 0.5~1.3 年预测，自然恢复期按 2 年预测。

4.3.4. 预测结果

本工程施工期及自然恢复期土壤流失总量 595.2t，新增土壤流失量 433.0t，详见表 4.3-2。

表 4.3-2 水土流失预测汇总表

预测单元		建设期 (t)			背景流失量 (t)	新增水土流失量 (t)
		施工期	自然恢复期	合计		
丰南变电站扩建工程	站区	1.6	0.0	1.6	0.2	1.4
八德变电站扩建工程	站区	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
线路工程	塔基区	121.0	26.6	147.6	33.4	114.2
	塔基施工场地区	211.3	47.7	259.0	76.4	182.6
	牵张场区	2.0	3.6	5.6	5.6	0.0
	施工道路区	147.6	33.6	181.2	46.6	134.6
	小计	481.9	111.5	593.4	162.0	431.4
合计		483.7	111.5	595.2	162.2	433.0

4.4. 水土流失危害分析

本项目建设过程中，项目占地范围内的地表将受到不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，具有影响范围及时段集中的特点，如不采取水土保持措施，开挖形成裸露地面和松散堆土产生的水土流失，很容易对区域土地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害，其具体表现为以下几个方面：

(1) 对区域生态环境的影响

本工程永久占地面积为 1.03hm²，分布于站区、塔基区，该区域部分用地将被硬化、建筑物占压，将无法恢复到原有土地功能；占用耕地区域将对沿线行政区的土地资源、农业生产有一定的影响，占用园地、林地区域将对仪陇县、阆中市的植被覆盖有一定的影响，但占地面积相对较小，其影响可控制在一定范围内。项目在施工过程中若不注意规范施工，乱堆弃渣、乱修临时建筑物，也会造成土地资源的浪费，若植被遭到破坏容易引起植被退化，影响生态景观，加剧水土流

失。

(2) 对工程本身可能造成的危害

项目的土石方工程有场地平整、基础、接地槽等的开挖回填，机械碾压等施工行为将影响这些单元土层的稳定性，为水土流失的加剧创造了条件。如果不及时做好相应治理，对本工程的形象造成破坏，原地表形态的改变，引起的水土流失可能对工程的安全运行造成影响。

4.5. 指导性意见

本工程水土流失重点时段为建设期，重点区域为线路工程塔基区、施工道路区，因此，以上区域应该为水土流失防治的重点区段。

(1) 施工完成后应及时采取整地及植物措施，控制其水土流失。

(2) 对施工临时占地区应在施工的全过程采取临时防护措施，临时占地区完工后采取植物措施进行植被恢复。

(3) 为控制施工建设期水土流失，土建施工开始前，必须作好施工建设期临时防护措施、临时堆土的处置措施，同时制定施工管理计划。

5. 水土保持措施

5.1. 防治区划分

5.1.1. 分区依据

本方案根据工程占地类型和用途、占用方式、工程施工时间布置及建设顺序、工程地区水土流失状况及水土流失防治目标，结合项目区域自然环境状况等进行水土流失防治分区，详细如下：

- (1) 各分区之间具有显著差异性，各分区内造成水土流失的主导因子相近或相似；
- (2) 一级分区应具有控制性、整体性、全局性，按工程类型划分区；
- (3) 二级分区按工程性质分区，以下分区应结合工程布局 and 施工区进行逐级分区。

5.1.2. 防治分区

结合本工程水土流失特点及后续管护的需求，本工程水土流失防治分区划分为丰南变电站扩建工程、八德变电站扩建工程、线路工程 3 个一级防治分区；丰南变电站扩建工程划分为站区 1 个二级防治分区，八德变电站扩建工程划分为站区 1 个二级防治分区，线路工程划分为塔基区、塔基施工场地区、牵张区、施工道路区 4 个二级防治分区。

表 5.1-1 水土流失防治分区

防治分区		面积 (hm ²)	备注
一级分区	二级分区		
丰南变电站扩建工程	站区	0.06	
	小计	0.06	
八德变电站扩建工程	站区	0.01	
	小计	0.01	
线路工程	塔基区	0.96	
	塔基施工场地区	2.17	
	牵张区	0.28	
	施工道路区	1.32	包括机械运输道路和人抬道路。
	小计	4.73	
合计		4.80	

5.2. 措施总体布局

根据本工程建设过程中各地形单元水土流失的特点、危害程度以及水土流失防治目标，在对主体工程中具有水土保持功能的防护措施基础上，结合工程的特点和已有的防治措施，合理、全面、系统的规划，提出各种工程地形单元新增的一些水土保持措施，使之形成一个完整的水土流失防治体系。

5.2.1. 丰南变电站扩建工程

(1) 站区

施工过程中对开挖土石方进行苫盖。

5.2.2. 八德变电站扩建工程

(1) 站区

施工过程中对开挖土石方进行苫盖。

5.2.3. 线路工程

(1) 塔基区

施工前，对塔基开挖区域进行表土剥离，堆放在塔基施工场地；施工场地铺彩条布。施工过程中，对临时堆土周边采用植生带拦挡和彩条布苫盖；有汇水区域的塔基周围布设浆砌石排水沟接入周边沟道。施工后期，施工区回覆表土、土地整治、耕地恢复、撒播草籽。

(2) 塔基施工场地区

施工过程中采取彩条布铺垫措施；施工结束后采取土地整治、耕地恢复、撒播草籽。

(3) 牵张场区

施工前，牵张场铺设棕垫，跨越施工场地铺垫彩条布。施工后期，进行土地整治，原耕地复耕，其他土地栽植灌木和撒播草籽。

(4) 施工道路区

机械运输道路开挖前，进行表土剥离，并对剥离的表土植生带拦挡和彩条布苫盖；机械运输道路施工过程中设置临时排水沟进行临时防护；施工结束后进行表土回覆、土地整治、耕地恢复、植被恢复措施。

防治措施体系详见表 5.2-1、图 5.2-1。

表 5.2-1 水土流失防治措施体系表

防治分区		水土保持措施	措施类型
丰南变电站扩建工程	站区	彩条布苫盖	临时措施
八德变电站扩建工程	站区	彩条布苫盖	临时措施
线路工程	塔基区	浆砌石排水沟	工程措施
		表土剥离	
		表土回覆	
		土地整治	
		耕地恢复	植物措施
		撒播草籽	
		植生带拦挡	临时措施
		彩条布苫盖	
	彩条布铺垫		
	塔基施工场地区	土地整治	工程措施
		耕地恢复	植物措施
		撒播草籽	
		彩条布铺垫	临时措施
	牵张场区	土地整治	工程措施
		耕地恢复	植物措施
		撒播草籽	
		栽植灌木	临时措施
		彩条布铺垫	
	施工道路区	表土剥离	工程措施
		表土回覆	
土地整治			
耕地恢复		植物措施	
撒播草籽			
栽植灌木		临时措施	
植生带拦挡			
彩条布苫盖			
临时排水沟			

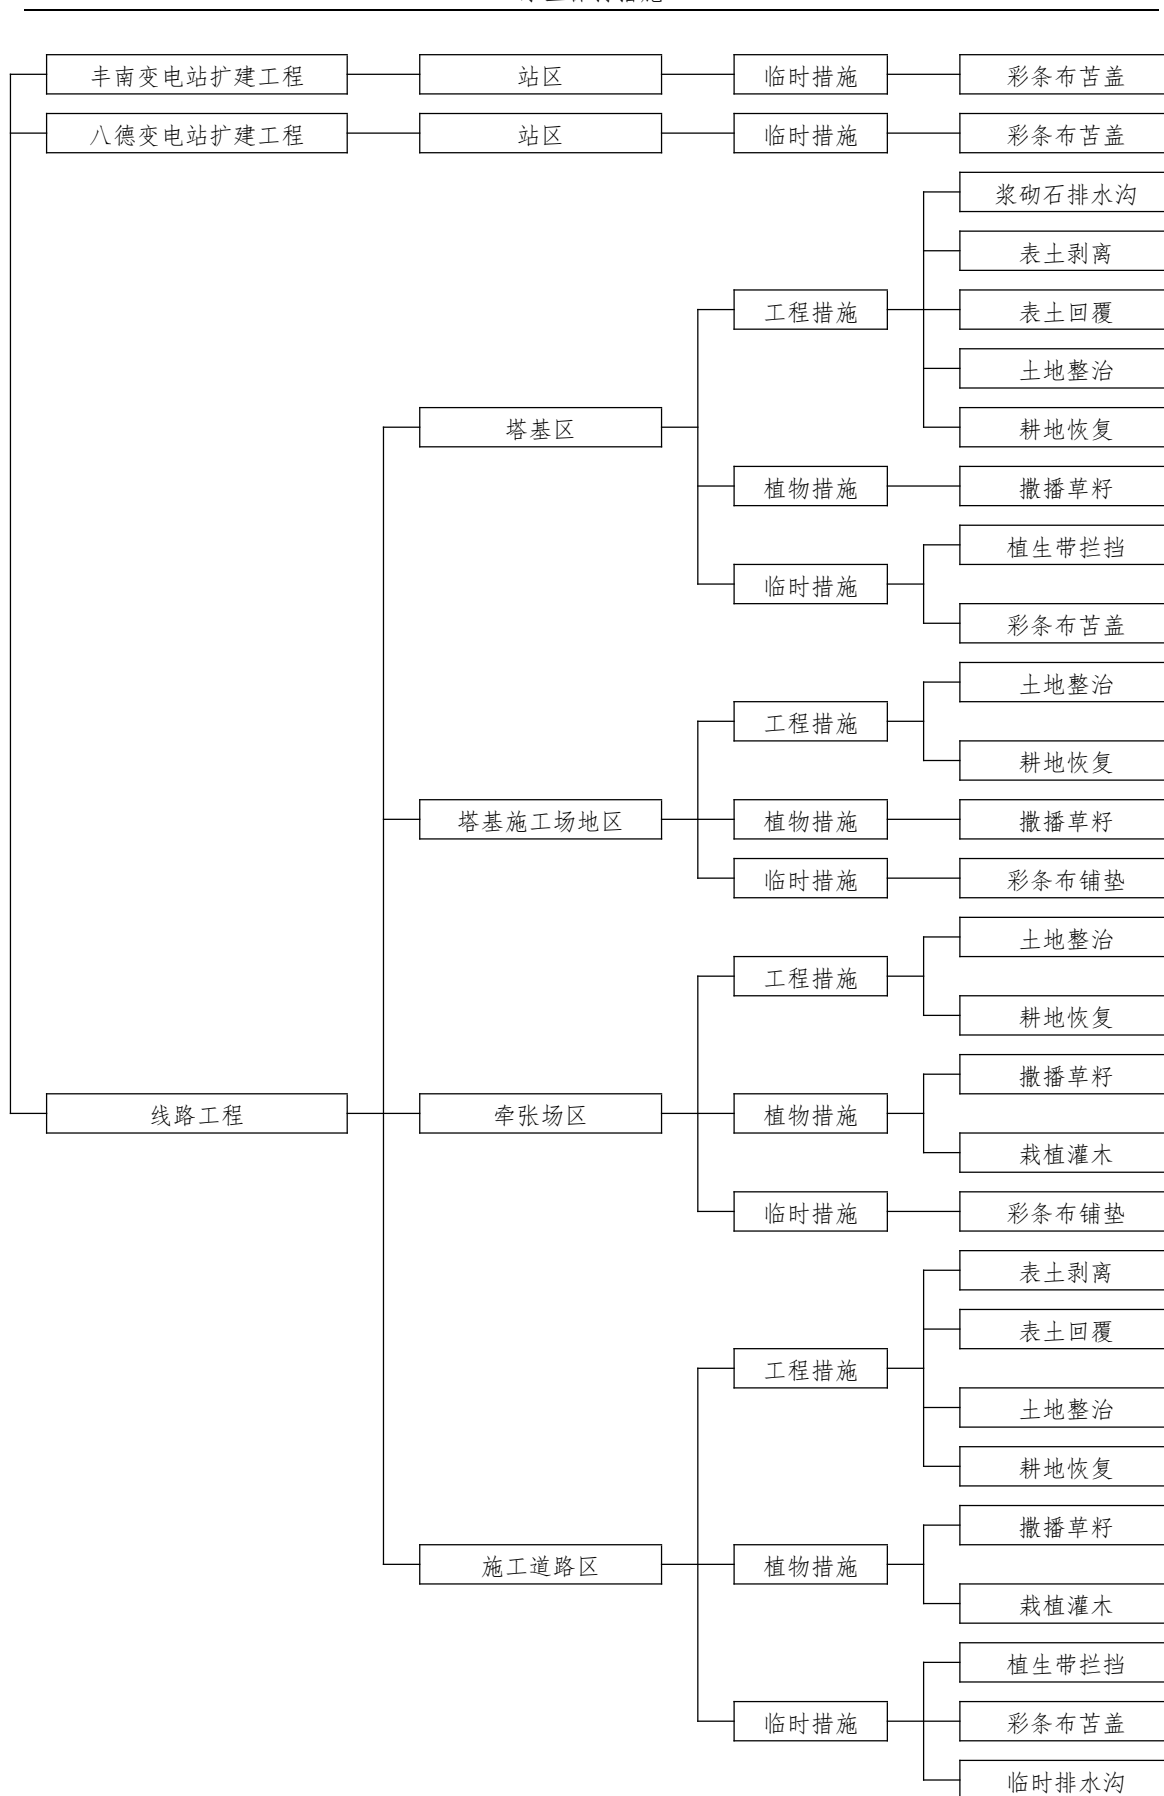


图 5.2-1 水土流失防治措施体系框图

5.3. 分区措施布设

5.3.1. 分区水土流失措施布设

5.3.1.1. 丰南变电站扩建工程

(1) 站区

1) 工程措施

——彩条布苫盖

施工过程中开挖土石方表面需进行覆盖防护，避免受到雨水冲刷造成水土流失。为防止雨水冲刷而产生新的水土流失，考虑对临时堆土区采取必要的防护措施，堆土坡顶、坡面采用彩条布苫盖，彩条布边缘用硬物压盖。彩条布苫盖 500m²。

5.3.1.2. 八德变电站扩建工程

(1) 站区

1) 工程措施

——彩条布苫盖

施工过程中开挖土石方表面需进行覆盖防护，避免受到雨水冲刷造成水土流失。为防止雨水冲刷而产生新的水土流失，考虑对临时堆土区采取必要的防护措施，堆土坡顶、坡面采用彩条布苫盖，彩条布边缘用硬物压盖。彩条布苫盖 100m²。

5.3.1.3. 线路工程

(1) 塔基区

1) 工程措施

——浆砌石排水沟

塔基排水沟主要布设在山坡侧汇水面的雨水及其它地表水对基面有冲刷影响的塔基处，沟底纵坡 2%，施工时根据实际地形情况作适当调整，以保证排水沟水流顺畅。排水沟断面尺寸上底宽×下底宽×高=0.5m×0.4m×0.5m，长为 100m，工程量为 11m³。

——表土剥离及回覆

施工之前对扰动超过 20cm 且占用耕地、园地、林地区域进行表土剥离，剥离厚度按 0.10m~0.30m 考虑，施工结束后将剥离的表土全部回覆至塔基区。表土剥离及回覆 0.58hm²、0.12 万 m³。

——土地整治、耕地恢复

施工结束后对塔基区进行杂物清理、场地平整、土壤翻耕等，从而达到改善立地条件、保持水土和促进林草生长或复耕的目的。土地整治 0.56hm^2 、耕地恢复 0.37hm^2 。

2) 植物措施

——撒播草籽

考虑到后期杆塔运行、检修、维护便利及工程运行安全，在施工后期，除混凝土浇筑的桩基和护坡等硬化区域外进行清理，撒播草籽进行恢复植被。撒播面积 0.56hm^2 ，撒播草籽密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，撒播量 45kg 。

3) 临时措施

——彩条布苫盖、植生袋拦挡

塔基区表土剥离后，临时存放于塔基施工场地一角，表土及开挖土石方分别堆放，堆土坡顶及坡面采用彩条布苫盖，坡脚采用植生袋压盖。彩条布苫盖 2000m^2 ，植生袋拦挡 30m^3 。

——铺设彩条布

塔基区施工过程中需堆放些设备、砂石材料等，为减小施工过程中对地表植被的破坏，铺设一定量的彩条布，铺设彩条布 500m^2 。

(2) 塔基施工场地区

1) 工程措施

——土地整治、耕地恢复

施工结束后，对塔基施工场地进行杂物清理、场地平整、土壤翻耕等，从而达到改善立地条件、保持水土和促进林草生长或复耕的目的。土地整治 1.30hm^2 、耕地恢复 0.87hm^2 。

2) 植物措施

——撒播草籽

塔基施工场地施工完成后进行土地整治，并撒播草籽对扰动地表区域进行植被恢复。撒播面积 1.30hm^2 ，撒播草籽密度 $80\text{kg}/\text{hm}^2$ ，撒播量 104kg 。

3) 临时措施

——铺设彩条布

塔基施工场地施工过程中需堆放些设备、砂石材料等，为减小施工过程中对

地表植被的破坏，在施工场地铺设一定量的彩条布，铺设彩条布 800m²。

(3) 牵张场区

1) 工程措施

——土地整治、耕地恢复

施工结束后，对牵张场进行杂物清理、场地平整、土壤翻耕等，从而达到改善立地条件、保持水土和促进林草生长或复耕的目的。土地整治 0.17hm²、耕地恢复 0.11hm²。

2) 植物措施

——撒播草籽、栽植灌木

施工结束后，土地整治区域进行“灌-草”恢复植被，恢复植被面积 0.17hm²。撒播草籽密度 80kg/hm²，撒播量 14kg；栽植灌木密度 1200 株/hm²，栽植灌木 204 株。

3) 临时措施

——彩条布铺垫

为方便机械设备运行，在牵张场地内规划出施工通道，通道做适当平整后铺设彩条布，可降低重型机械及车辆对原地貌的扰动。彩条布铺垫 200m²。

(4) 施工道路区

1) 工程措施

——表土剥离及回覆

施工之前对扰动超过 20cm 且占用耕地、园地、林地区域进行表土剥离，剥离厚度按 0.10~0.30m 考虑，施工结束后将剥离的表土全部回覆至需要植被恢复、耕地恢复区域。表土剥离及回覆 0.18hm²、0.03 万 m³。

——土地整治、耕地恢复

施工结束后，对机械运输道路进行杂物清理、场地平整、土壤翻耕等，从而达到改善立地条件、保持水土和促进林草生长或复耕的目的。土地整治 0.79hm²、耕地恢复 0.53hm²。

2) 植物措施

——撒播草籽、栽植灌木

施工结束后，施工道路土地整治区域进行“灌-草”恢复植被，恢复植被面积 0.79hm²。撒播草籽密度 80kg/hm²，撒播量 63kg；栽植灌木密度 1200 株/hm²，栽

植灌木 948 株。

3) 临时措施

——表土临时防护

机械运输道路表土剥离后，临时堆放在道路一侧。堆土坡顶及坡面采用彩条布苫盖，坡脚采用植生袋压盖。彩条布苫盖 300m²，植生袋拦挡 15m³。

——临时排水沟

本方案针对道路局部低洼地段设计临时排水沟，临时排水沟采用梯形断面，断面尺寸上底宽×下底宽×高=0.5m×0.3m×0.3m，排水沟出口接入天然沟道或者已有道路排水沟等，临时排水沟长 48m，开挖土方 6m³。

5.3.2. 防治措施工程量汇总

本工程水土保持措施汇总见表 5.3-1~5.3-3。

表 5.3-1 水土保持工程措施汇总表

防治分区		工程措施	单位	工程量
线路工程	塔基区	浆砌石排水沟	m	100
			m ³	11
		表土剥离	hm ²	0.58
			万 m ³	0.12
		表土回覆	万 m ³	0.12
		土地整治	hm ²	0.56
	耕地恢复	hm ²	0.37	
	塔基施工场地区	土地整治	hm ²	1.30
		耕地恢复	hm ²	0.87
	牵张场区	土地整治	hm ²	0.17
		耕地恢复	hm ²	0.11
	施工道路区	表土剥离	hm ²	0.18
			万 m ³	0.03
		表土回覆	万 m ³	0.03
		土地整治	hm ²	0.79
	耕地恢复	hm ²	0.53	

表 5.3-2 水土保持植物措施汇总表

防治分区		植物措施	单位	数量	防护面积(hm ²)
线路工程	塔基区	撒播草籽	kg	45	0.56
	塔基施工场地区	撒播草籽	kg	104	1.30
	牵张场区	栽植灌木	株	204	0.17
		撒播草籽	kg	14	
	施工道路区	栽植灌木	株	948	0.79
		撒播草籽	kg	63	

表 5.3-3 水土保持临时措施汇总表

防治分区		临时措施	单位	工程量
丰南变电站扩建工程	站区	彩条布苫盖	m ²	500
八德变电站扩建工程	站区	彩条布苫盖	m ²	100
线路工程	塔基区	植生带拦挡	m ³	30
		彩条布苫盖	m ²	2000
		彩条布铺垫	m ²	500
	塔基施工场地区	彩条布铺垫	m ²	800
	牵张场区	彩条布铺垫	m ²	200
	施工道路区	植生带拦挡	m ³	15
		彩条布苫盖	m ²	300
		临时排水沟	m	48
			m ³	6

6. 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》(办水保〔2020〕161号),对编制水土保持方案报告书的生产建设项目(即征占地面积在 5hm^2 以上或者挖填土石方总量 5万 m^3 以上的生产建设项目),生产建设单位应当自行或者委托具有相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。本项目征占地总面积为 4.80hm^2 ,项目土石方挖填总量为 2.826万 m^3 需编水土保持方案报告表。因此,本项目可不开展水土保持专项监测工作。但建设单位应落实水土流失防治责任和义务,加强水土保持工程实施过程中的管理和后期管护,对工程施工过程可能造成水土流失的区域进行必要的自主监测,为项目竣工验收提供依据。

7. 水土保持投资估算及效益分析

7.1. 投资估算

7.1.1. 编制原则及依据

7.1.1.1. 编制原则

水土保持投资估算的价格水平年、人工单价、主体材料价格、估算定额、取费项目及费率等与主体工程一致，不足部分按《水土保持概算（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67号文）规定计列。

7.1.1.2. 编制依据

- (1) 《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018年版）；
- (2) 《电力建设工程预算定额》（2018年版）；
- (3) 水利部水总[2003]67号《水土保持工程概（估）算编制规定》和《水土保持工程概算定额》；
- (4) 国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》2002年10号文；
- (5) 国家发展和改革委员会办公厅、建设部办公厅关于“印发修订建设监理与咨询服务收费标准的工作方案的通知”（发改办价格[2005]632号）；
- (6) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办水保〔2019〕448号）；
- (7) 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；
- (8) 《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）；
- (9) 四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定>相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610号）；
- (10) 《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）。

7.1.2. 编制说明及估算成果

7.1.2.1. 编制说明

- (1) 费用组成

本工程水土保持投资包括主体工程中具有水土保持功能的工程投资和新增水土保持工程投资。水土保持投资包括工程措施费用、植物措施费用、临时措施费用、独立费用、基本预备费、水土保持补偿费。

(2) 人工预算单价

人工预算单价定额按主体工程建筑工程人工单价，人工预算单价按 9.78 元/工时计。

(3) 材料预算价格

主要材料预算价格采用主体工程材料预算价格，主体工程没有的采用市场价，包含运杂费、采购保管费等费用。其他材料预算价格：采用主体工程的其他材料预算价格，主体工程没有的采用当地物价部门发布工程建设材料预算价格，种苗价格采用现行市场价格，详细见表 7.1-1。

表 7.1-1 主要材料单价表

编号	材料名称	单位	单价(元)	备注
1	水泥	t	548.05	含运杂费、采购及保管费
2	碎石 40	m ³	178.54	含运杂费、采购及保管费
3	中砂	m ³	224.87	含运杂费、采购及保管费
4	水	m ³	4.63	含运杂费、采购及保管费
5	灌木	株	25	含运杂费、采购及保管费
6	混合草籽	kg	84	含运杂费、采购及保管费
7	农家肥	m ³	200	含运杂费、采购及保管费
8	植生袋	个	1.5	含运杂费、采购及保管费
9	彩条布	m ²	2.2	含运杂费、采购及保管费

(4) 定额费率

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)中规定，水土保持措施定额费率应按主体费率，具体见表 7.1-2。

7.1-2 水土保持措施定额费率表

序号	名称及规格	单位	费率
一	直接费		
1	直接工程费		
2	措施费		
2.1	冬雨季施工增加费、施工工具用具使用费、施工机构迁移费	%	10.77
2.2	临时设施费	%	6.60
2.3	安全文明施工费	%	3.55
二	间接费		
1	规费		
1.1	社会保险费、住房公积金	%	37.62
1.2	危险作业意外伤害保险费	%	0.00
2	企业管理费	%	35.76
3	施工企业配合调试费	%	1.06
三	企业利润	%	5
四	税金	%	9
五	扩大系数	%	10

(5) 水土保持工程估算编制

1) 工程措施费用

水土保持工程措施指为减轻或避免因开发建设造成植被破坏和水土流失而兴建的永久性水土保持工程，按设计工程量乘以工程单价进行计算。

2) 植物措施费用

水土保持植物措施指防治水土流失而采取的植物防护工程、植物恢复工程及绿化美化工程等，由材料费和种植费组成，其中材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量进行编制，种植费按《水土保持工程估算定额》进行编制。

3) 临时措施费用

水土保持临时措施指为防止施工过程中产生水土流失而采取的临时水保工程及其建设期的临时施工场地、道路等区域的水保防护工程，包括临时防护工程和其他临时工程，临时防护工程按设计方案的工程量乘以单价计算，其它临时措施费按水保新增的工程措施和植物措施投资的 2.0% 计取。

4) 独立费用

水土保持独立费用包括建设单位管理费、水土保持监理费、水土保持监测费、工程勘测设计费、水土保持验收服务等五项组成。

①建设管理费：按水保新增工程措施、植物措施和临时措施投的 2.0% 计算。

②科研勘察设计费：本工程科学研究试验费不考虑，勘测设计费参照《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）要求计列，水土保持方案编制费按实际签订合同费用计费。

③水土保持监理费：参照《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）要求计列，并参考同类工程实际情况计列。

④水土保持监测费：根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）中简化验收报备的要求，该项目属于实行承诺制管理的项目，对水土保持监测不做相应要求。

⑤水土保持验收服务费：参照同类工程实际情况计列。

5) 基本预备费

根据《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号），基本预备费按工程措施费用、植物措施费用、临时措施费用、独立费用四部分之和的5%计列（不含主体已有措施投资）。按照国家发展计划委员会文件“计投资〔1999〕1340号文”的规定，价格上涨指数为零，不再计列价差预备费。

(7) 水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）、《四川省水利厅 四川省财政厅 四川省发展和改革委员会 中国人民银行成都分行 关于进一步做好水土保持补偿费征收工作的通知》（川水函〔2019〕1237号）等文件的要求，本工程水土保持补偿费按1.3元/m²一次性计征。本工程占地面积为48000m²，水土保持补偿费为62400元。

7.1.2.2. 估算成果

本工程水土保持总投资56.77万元，主体已列1.21万元，方案新增55.56万元。新增投资中工程措施12.80万元、植物措施11.71万元、临时措施4.87万元、独立费用17.59万元、基本预备费2.35万元、水土保持补偿费6.24万元，详见表7.1-3~7.1-5。

表 7.1-3 水土保持投资估算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	新增投资				主体已有投资	合计
		建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用		
第一部分 工程措施		12.80				1.21	14.01
1	线路工程	12.80				1.21	14.01
	塔基区	7.93				1.21	9.14
	塔基施工场地区	1.64					1.64
	牵张场区	0.21					0.21
	施工道路区	3.02					3.02
第二部分 植物措施				11.71			11.71
1	线路工程			11.71			11.71
	塔基区			0.49			0.49
	塔基施工场地区			1.12			1.12
	牵张场区			5.55			5.55
	施工道路区			4.55			4.55
第三部分 施工临时工程		4.87					4.87
1	丰南变电站扩建工程	0.41					0.41
	站区	0.41					0.41
2	八德变电站扩建工程	0.06					0.06
	站区	0.06					0.06
3	线路工程	3.91					3.91
	塔基区	2.58					2.58
	塔基施工场地区	0.46					0.46
	牵张场区	0.11					0.11
	施工道路区	0.76					0.76
4	其他临时工程	0.49					0.49
第四部分 独立费用					17.59		17.59
1	建设管理费				0.59		0.59
2	科研勘测设计费				8.00		8.00
3	水土保持监理费				5.00		5.00
4	水土保持验收报告编制费				4.00		4.00
I	第一至第四部分之和	17.67	0.00	11.71	17.59	1.21	48.18
II	基本预备费						2.35
III	价差预备费						0.00
IV	水土保持补偿费						6.24
V	工程总投资						56.77

表 7.1-4 独立费用估算表

序号	工程或费用名称	计算依据	合计 (万元)
第五部分独立费用			17.59
一	建设管理费	按水保新增工程措施、植物措施和临时措施投的 2.0% 计算。	0.59
二	科研勘测设计费	按实际签订合同费用计费。	8.00
三	水土保持监理费	根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670 号) 要求计列, 并参考同类工程实际情况计列。	5.00
四	水土保持验收报告编制费	参照同类工程实际情况计列	4.00

表 7.1-5 水土保持补偿费估算表

行政区	征占用地面积 (m ²)	征收标准 (元/m ²)	费用 (元)
仪陇县	20500	1.3	26650
阆中市	27500	1.3	35750
合计	48000	1.3	62400

7.2. 效益分析

本工程项目建设区面积 4.80hm², 其中永久占地面积 1.03hm², 临时占地面积 3.77hm²。通过水土保持各项措施的有效实施, 在水、土和生物等方面改善项目区内微生态环境, 促进项目区域生态环境的可持续发展。本工程水土保持措施实施后, 可治理水土流失面积 4.79hm²、林草植被建设面积 2.81hm²、可减少土壤流失量 433.0t、渣土挡护量 1.403 万 m³、表土剥离及保护量 0.149 万 m³。设计水平年水土流失治理度达到 99.8%, 土壤流失控制比为 1.0, 渣土防护率可达到 99.3%, 表土保护率可达到 99.3%, 林草植被恢复率可达到 99.6%, 林草覆盖率达到 58.5%, 防治效果达到防治目标的要求。

本工程防治目标预期达标情况见表 7.2-1。

表 7.2-1 设计水平年方案目标值计算表

序号	项目	计算方法	计算数据		计算结果	目标值	达标情况
1	水土流失治理度	水土保持措施达标面积/建设区水土流失总面积	水土保持措施达标面积 4.79hm ²	建设区水土流失总面积 4.80hm ²	99.8%	97%	达标
2	土壤流失控制比	土壤侵蚀模数容许值/治理后土壤侵蚀模数	项目容许值 500t/km ² ·a	治理后土壤侵蚀模数 500t/km ² ·a	1.0	1.0	达标
3	渣土防护率	采取水土保持措施实际拦挡的土(石、渣)量/土(石、渣)总量	采取水土保持措施实际拦挡的土(石、渣)量 1.403 万 m ³	土(石、渣)总量 1.413 万 m ³	99.3%	92%	达标
4	表土保护率	保护的表土数量/可剥离表土数量	保护的表土数量 0.149 万 m ³	可剥离表土数量 0.15 万 m ³	99.3%	92%	达标
5	林草植被恢复率	林草植被面积/可恢复林草植被面积	林草植被面积 2.81hm ²	可恢复林草植被面积 2.82hm ²	99.6%	97%	达标
6	林草覆盖率	林草植被面积/项目建设区总面积	林草植被面积 2.81hm ²	项目建设区总面积 4.80hm ²	58.5%	25%	达标

8. 水土保持管理

为保证本项目水土保持方案顺利实施、工程新增水土流失得到有效控制、项目工程区及周边生态环境良性发展，建设单位将严格按照水土保持方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成水土保持各项措施。预防监督部门应定期对水土保持方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行监督、检查，在监督方法上可采用建设单位定期汇报与实地检测相结合，必要时采用行政、经济、司法等多种手段措施保证水土保持方案的完全落实。

8.1. 组织管理

本方案编制严格按照《中华人民共和国水土保持法》及国家有关法律、法规进行，要保证方案提出的工程各项水土保持措施的实施和落实，搞好项目水土保持的组织领导工作是关键。对此本项目的实施主要将做好以下水土保持组织领导工作：

(1) 建立健全项目水土保持组织领导体系，确保各项水土保持措施的实施应由业主迅速建立本项目水土保持领导小组，该小组直接由建设单位领导，小组成员由建设单位、施工单位（招标确定）、设计单位、监理单位（由建设单位委托）等组成，领导小组主要负责本项目建设过程中的水土保持工作的领导、管理和实施；并配合地方水行政主管部门对本建设项目水土保持措施实施情况进行监督和管理，搞好本工程水土保持工作。

(2) 加强《水土保持法》学习、宣传工作，提高工程建设的水土保持意识 建设单位、施工单位、设计单位和施工监理单位等应加强《水土保持法》等法律法规的学习和宣传工作，同时地方水行政主管部门应积极配合建设单位 开展此项工作，提高建设单位、施工单位和设计单位等对水土保持基本国策的认识，增强其法制观念，使项目实施真正依照《水土保持法》等有关法律法规 进行。同时，加强对沿线居民水土保持的宣传和教育，也是搞好沿线生态环境 的关键。

(3) 统一组织领导，加强部门间的配合，搞好本工程的水土保持 本水土保持方案由建设单位负责统一组织领导实施，地方水行政主管部门、工程施工监理和设计单位大力配合、监督，搞好本工程的水土保持工作，施工 单位应严格按照工程设计的各项水土保持的技术要求进行施工，确保本水土保持方案顺利实施，有

效控制工程实施过程中的水土流失。

(4) 明确职责，做好方案实施监督工作 地方水行政主管部门依照《水土保持法》及有关法律、法规的授权，在方案实施过程中对项目水土保持工作进行监督和检查，并依法在“建设工程竣工验收时，应当同时验收水土保持设施”，这是保证本方案实施的必要工作。

8.2. 后续设计

为了切实做好在建工程的水土保持工作，要求主体工程设计单位应该依据批复的水土保持方案，开展水土保持施工图专项设计，确保本方案提出的各项水土流失防治措施特别是新增防治措施落实到项目建设中，切实发挥方案设计的水土保持各项措施的防护效用，并要求主体工程设计单位核定该工程水土保持投资（包括水土保持补偿费），纳入主体工程总投资中。

水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准；水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。

8.3. 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）中简化验收报备的要求和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号），该项目属于实行承诺制管理的项目，对水土保持监测不做相应要求，但生产建设单位应依法做好水土流失防治工作。

8.4. 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）中要求，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。根

据本工程挖填方量，建议纳入主体工程监理工作范畴，并按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。

8.5. 水土保持施工

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）中要求，施工过程中应严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被，生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在招标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。项目水土保持工程应与主体工程同时施工，并严格按照本方案提出的各项水土保持措施和建议，根据主体工程施工进度，合理安排各项水土保持措施的施工，确保各项水土保持工程能长期、高效地发挥作用。在具体施工中应与施工承包商明确水土流失的防治责任。

主体工程的发包标书中应有水土保持工程的工程量、单价和投资等施工要求，并列入招标合同中，水土保持方案实施单位必须具备相应的资质。承包商具有防治水土流失的责任，对施工中造成的新增水土流失，负责临时防护及治理。

8.6. 水土保持设施后续管理

建设单位将严格按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保[2019]172号）和水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）中相关规定，在建设项目投产使用前，组织设计、施工、监理等单位对工程进行自检，主要检查内容：检查水土保持设施是否符合设计要求、施工质量、投资使用和管理维护责任落实情况；评价防治水土流失效果，对存在问题提出处理意见等；是否满足开发建设项目水土流失防治标准及水土保持设计确定的水土流失防治目标；建成的水土保持设施的数量和投资是否达到初步设计水土保持章节规定内容；各项措施是否配置合理，是否按规定实施，水土保持设施的质量情况；水土保持设施的管理、维护措施是否落实等；通过现场检查，明确验收前需要解决的遗留问题，提出验收评估的结论与建议。

建设单位应按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。

根据水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见(水保〔2019〕160号)要求,实行承诺制或者备案制管理的项目,只需要提交水土保持设施验收鉴定书,其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。在水土保持设施验收合格后,将通过官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书。对于公众反映的主要问题和意见,建设单位应当及时给予处理或回应。在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前,向水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书。生产建设单位和第三方机构分别对水土保持设施验收鉴定书等材料的真实性负责。水土保持设施验收合格后,建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程水土保持方案报告表专家意见

姓名	刘胤	工作单位	平武县水利局
职称	高级工程师	手机号码	13608124473
专家库在库编号	CSZ-ST034		
<p>南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程位于四川省南充市仪陇县、阆中市，属扩建建设类项目。。主要建设内容包括丰南 110kV 变电站扩建工程；八德 220kV 变电站 110kV 间隔扩建工程；八德—丰南 110kV 线路工程，线路起于八德 220kV 变电站，止于丰南 110kV 变电站。新建线路 33.38km，其中架空线路 33.3km，电缆线路 0.08km。</p> <p>工程总占地面积 4.80 公顷，其中永久占地 1.03 公顷、临时占地 3.77 公顷，占地类型主要为耕地、园地、林地、公共管理与公共服务用地；挖填土石方总量 2.826 万立方米，其中挖方 1.413 万立方米（含表土剥离 0.15 万立方米），回填 1.413 万立方米（含表土回覆 0.15 万立方米），无余方；项目总投资 6351 万元，其中土建投资 1587 万元，资金来源为企业自筹；计划 2024 年 10 月开工建设，2025 年 12 月完工，总工期 15 个月。</p> <p>项目区地貌类型为丘陵地貌，属于西南紫色土区，涉及嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。</p> <p>按照水土保持相关法律、法规和规范性文件，建设单位国网四川省电力公司南充供电公司委托四川志德岩土工程有限责任公司于 2024 年 8 月编制了《南充仪陇丰南 110kV 输变电扩建工程水土保持方案报告表》（以下简称《报告表》）。经审核，《报告表》基本符合水土保持法律法规、技术标准及有关文件的规定，可上报审批或报备。主要审核意见如下：</p> <p>一、项目概况</p> <p>（一）项目组成、工程布置及施工组织介绍基本清楚。</p> <p>（二）工程占地、土石方平衡及流向介绍基本清楚。</p> <p>（三）项目及项目区概况介绍基本清楚。</p> <p>二、项目水土保持评价</p> <p>主体工程选址（线）水土保持制约性因素的分析与评价基本清楚和合理，工程建设方案与布局、工程占地、土石方平衡、施工工艺及方法评价较为全面、合理。</p> <p>三、水土流失防治责任范围</p> <p>水土流失防治责任范围 4.80 公顷，界定清楚。</p> <p>四、水土流失防治目标</p>			

水土流失防治执行等级合理，目标可行。本项目水土流失防治执行西南紫色土区一级标准符合规范要求，设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度 97%、土壤流失控制比 1.0、渣土防护率 92%，表土保护率 92%、林草植被恢复率 97%、林草覆盖率 25%。

五、水土保持措施布设

(一) 将水土流失防治区划分为为丰南变电站扩建工程区、八德变电站扩建工程区、线路工程区共 3 个一级区，其中线路工程区划分为塔基区、塔基施工场地区、牵张区、施工道路区 4 个二级防治分区。分区基本合理。


(二) 水土流失防治措施等级划分基本合理，措施体系布设较完整，满足有关规范的要求。分区防治措施布设如下：

- 1、丰南变电站扩建工程区：方案新增了彩条布苫盖措施。
- 2、八德变电站扩建工程区：方案新增了彩条布苫盖措施。
- 3、线路工程区：主体工程在塔基区计列了浆砌石排水沟措施，方案新增了表土剥离、表土回覆、土地整治、植生带拦挡、复耕、撒播草籽绿化、彩条布苫盖、彩条布铺垫措施；方案在塔基施工场地区新增了土地整治、复耕、撒播草籽绿化、彩条布铺垫措施；方案在牵张区新增了土地整治、复耕、灌草绿化、彩条布铺垫措施；方案在施工道路区新增了表土剥离、表土回覆、土地整治、植生带拦挡、复耕、灌草绿化、临时排水沟、彩条布苫盖措施。

六、水土保持投资估算


水土保持投资估算编制原则、依据、方法正确，估算结果基本合理。本项目水土保持补偿费计征面积 48000 平方米，补偿费 62400.00 元。

签字：



2024 年 8 月 13 日

此证件仅作为《南充仪陇丰南110kV输变电扩建工程水土保持方案报告表》技术审查专家身份证明之用

姓名	刘胤	
性别	男	
出生年月	1960年7月	
专业名称	工程	
资格名称	水土保持 高级工程师	评审组织 水利电力工程技术人员协会
		审批机关 省职改办
		批准时间 2003年1月



专家库在库编号：CSZ-ST034

查询网址：<http://slt.sc.gov.cn/>

联系电话：13608124473
